





REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estacion: SANTA CRUZ DE ANDAMARCA FITEL
Nombre de Localidad: SANTA CRUZ DE ANDAMARCA
Fecha: 29/04/2026 - 29/04/2026
Direccion: CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE ANDAMARCA
ID site: LI5152
CRQ: CRQ000000060698

Sticker Año mantenimiento

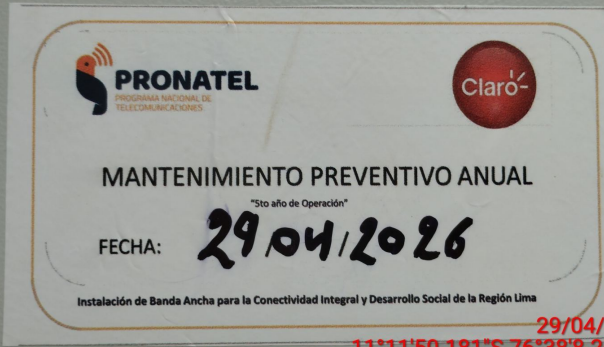

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

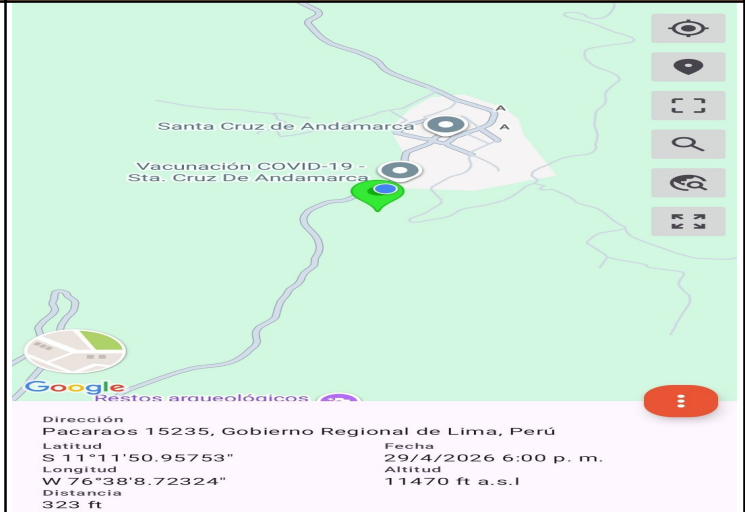

INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



DURANTE



DESPUES



LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



DURANTE



DESPUES



AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



DURANTE



DESPUES





CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM´s y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos
