




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estación: ASPITIA
Nombre de Localidad: SANTA CRUZ DE FLORES
Fecha: 23/04/2026 - 23/04/2026
Dirección: COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DE FLORES
ID site: LI0923
CRQ: CRQ000000055895

Sticker Año mantenimiento




Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

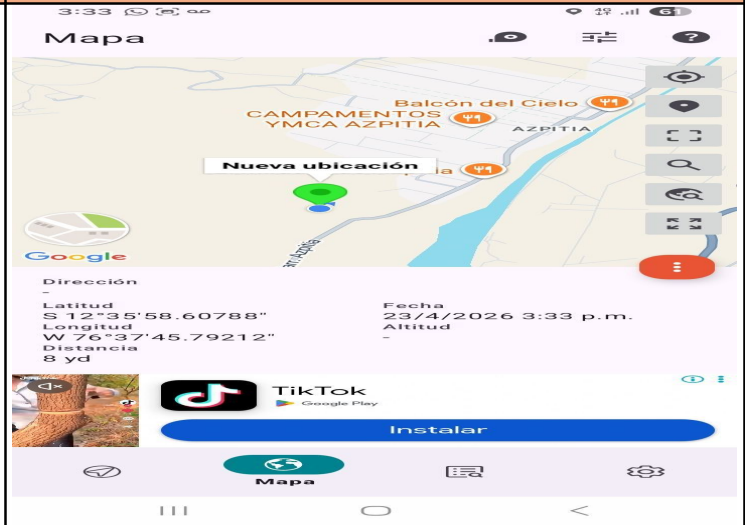


VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES

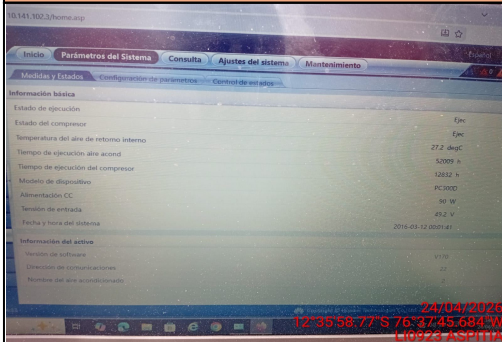

DURANTE

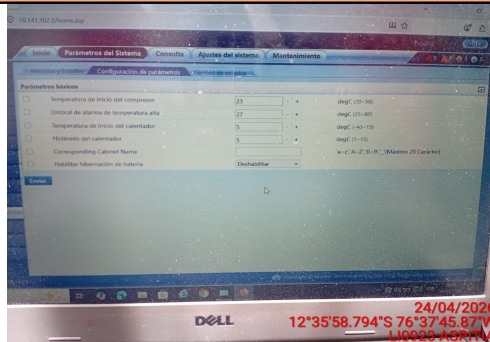

DESPUES



LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



DURANTE



DESPUES



LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES




DURANTE



DESPUES



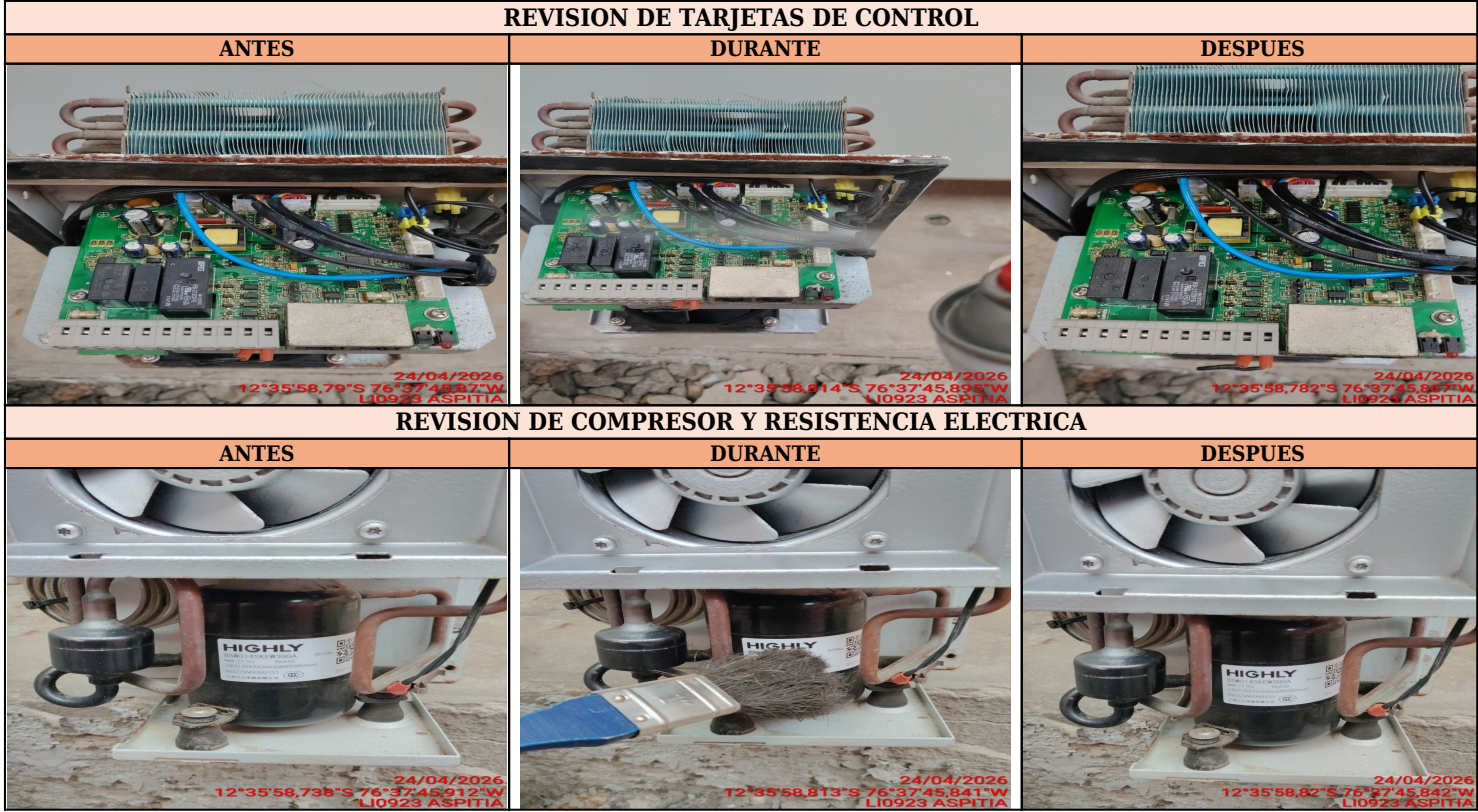

CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales
