


Gabinete Tx1: Estado: OK
Ventiladores: OK
A/A: OK
Filtros: N/A
Radios (#): 1
Routers (#): 1
Modem (#): 1
BBU (#): 1
Switch (#): 1
Media Converter (#): 1



Gabinete Tx 1 Abierto

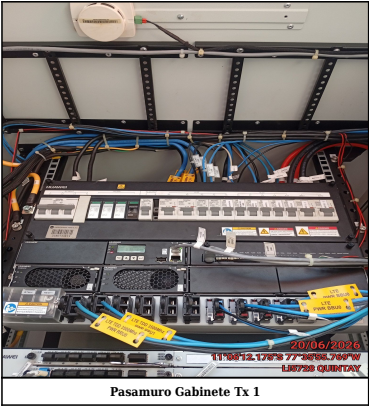


Pasamuro Gabinete Tx 1


V.- BTS:

BBU: Tipo: 5900
Estado: OK
FAN: OK
Cable FO: Estado: OK
Banda 1 (MHz): 3500
Cantidad: 1

VSWR: OK
Alarmas Externas: OK
Alarmas Internas: OK

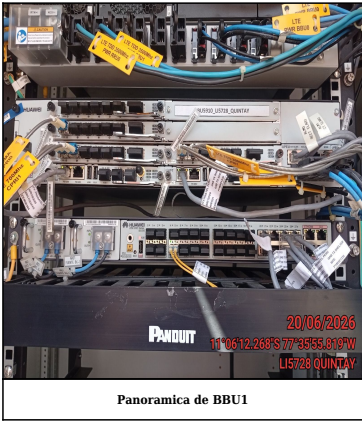


Panoramica de BBU1

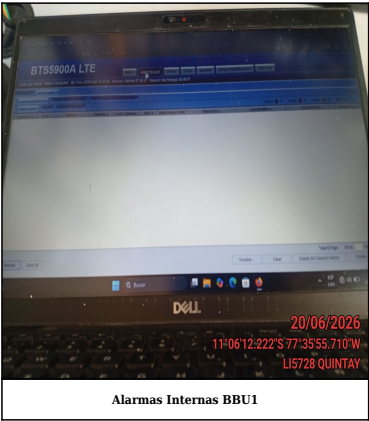


Alarmas Internas BBU1



Alarmas Externas

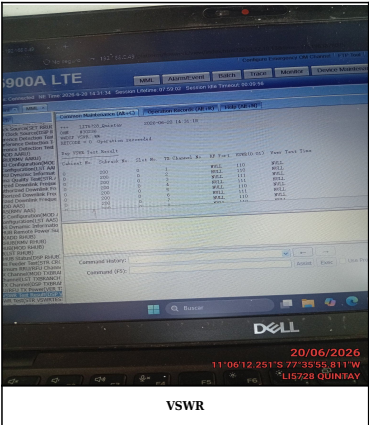

VSWR

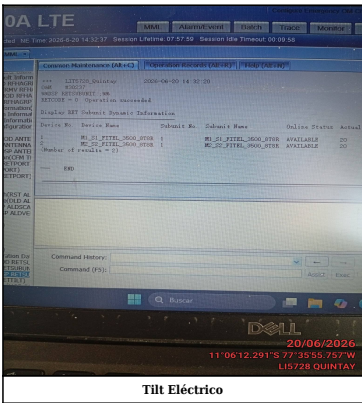

Tilt Eléctrico

VI.- SISTEMA RADIANTE:

Antenas:

Sectoriales TDD:	Estado:	OK
	Cantidad:	1
	Modelo:	nv
	Tilt m.1(°):	OK

Microondas:	Estado:	OK
	Cantidad:	1



Torre



Vulcanizado Conectores S1

RRU	Cantidad:	1
	Conectores:	OK
	Cables RF/IF:	OK

Luz de Balizaje:	Estado:	OK
	Cantidad:	1

Pararrayos:	Estado:	OK
-------------	---------	----



Vulcanizado Conectores S2



Vulcanizado Conectores S3

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado:	OK
Tipo:	unico
Cantidad:	1
Resistencia (Ω):	2.25
Topologia :	único



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

n.a

N/A

Observacion 1
