


	PARTE OPERATIVO DE MANTENIMIENTO DE SITE - ANNUAL		
---	--	--	--

ZONA	SAYAN	NOMBRE SITE:	QUINTAY	CODIGO SITE:	LI5728	FECHA :	2026-03-23 00:54:55
CRQ	CRQ000000039602	COORDENADAS	11°5'22.704"S 77°10.0.846	TÉCNICO RESPONSABLE	Anderson Mejia		

I.- INFRAESTRUCTURA

Site:	Modelo:	Geenfield			
	Tipo:	Indoor			
Torre:	Tipo:	Autosoportada Triangular			
	Estado:	OK			
	Altura (m):	30			
	Verticalidad:	OK			
	Pintura:	OK			
	Escalera:	OK			
	Línea de vida:	OK			
	Cable Vientos:	N/A			
	Grapas:	N/A			
	Templadores:	N/A			
	Base Templadores:	N/A			
	Base de Torre:	OK			
Paredes:	OK		VISTA PANORAMICA DEL SITE		
Concertina:	OK		VISTA PARED PARIMETRICA		
Puerta:	OK				
Chapa:	OK				

II.- SUMINISTRO DE ENERGIA AC:

Tipo de Instalacion:	Aérea	
Nivel de Tensión:	LBT	
Sistema de Conexión:	Monofásica	
N° Suministro:	NV	
PDP:	Estado:	OK
	Voltaje 1(VAC):	226
	ITM(A):	50
	TVSS	OK
	Corriente 1(AAC):	14

III.- SUMINISTRO DE ENERGIA DC:

Gabinete Rectificador:	Estado:	OK			
	Marca:	Huawei			
	Ventiladores:	OK			
	A/A:	OK			
	Filtros:	OK			
Power Core:	Marca:	Huawei			
	Modelo:	MTS9000A			
	Controlador:				
	Modelo:	SMU02B			
	Voltaje (VDC):	51			
	Carga (ADC):	16			
	LVBD/BLVD(VDC):	44			
	LVLD/LLVD(VDC):	47			
	Módulos:	Estado:	OK		
		Modelo1:	R4850G		
		Cantidad1:	2		
Bancada Total 1:	Estado:	OK			
	Cantidad:	3			
	Voltaje (V):	51			
	Marca1:	Huawei			
	Modelo1:	ESM-48150A1			
	Capacidad1(Ah):	150			
	Autonomia (Hr):	21			

IV.- GABINETE DE TRANSMISION:

Gabinete Tx1:

Estado:	OK
Ventiladores:	OK
A/A:	OK
Filtros:	OK
Radios (#):	1
Routers (#):	1
Modem (#):	0
BBU (#):	1
Switch (#):	0
Media Converter (#):	0



Gabinete Tx 1 Abierto




Pasamuro Gabinete Tx 1


V .- BTS:

BBU:


Tipo:	BBU5900
Estado:	OK
FAN:	OK
Cable FO:	Estado: OK
	Banda 1 (MHz): 3500
	Cantidad: 2
	VSWR: OK
	Alarmas Externas: OK
	Alarmas Internas: OK

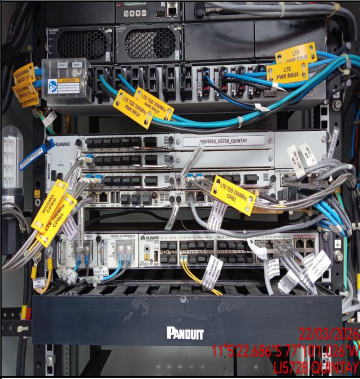


Panoramica de BBU1

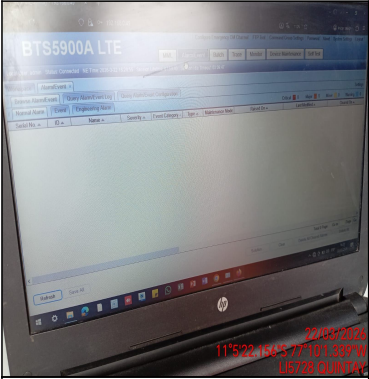


Alarmas Internas BBU1

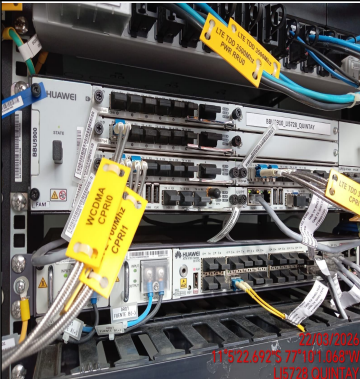

Alarmas Externas

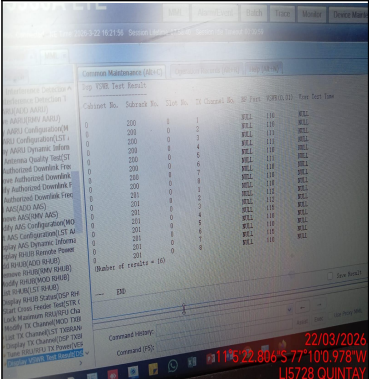

VSWR

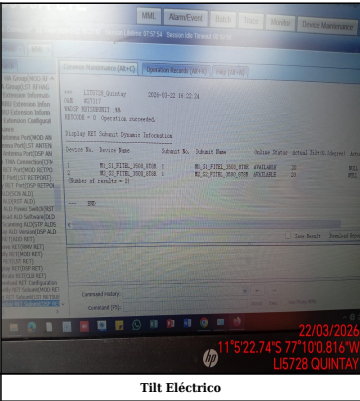

Tilt Eléctrico

VI .- SISTEMA RADIANTE:

Antenas:

Sectoriales TDD: Estado: OK
Cantidad: 10
Modelo: NV
Tilt m.1(*): OK

Microondas: Estado: OK
Cantidad: 1




Torre



Vulcanizado Conectores S1



Vulcanizado Conectores S2



Vulcanizado Conectores S3

RRU Cantidad: 2
Conectores: OK
Cables RF/IF: OK

Luz de Balizaje: Estado: OK
Cantidad: 1

Pararrayos: Estado: OK

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado: OK
Tipo: Parres
Cantidad: 3
Resistencia (Ω) 2.05
Topologia : Unico



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

NA

N/A

Observacion 1
