

I .- INFRAESTRUCTURA

Site:

Modelo:

Tipo:

greenfied

outdoor

Torre:

Tipo:

Estado:

Altura (m):

Verticalidad:

Pintura:

Escalera:

Línea de vida:

Cable Vientos:

Grapas:

Templadores:

Base Templadores:

Base de Torre:

autosoportada

triangular

OK

25

OK

OK

OK

OK

N/A

N/A

N/A

N/A

OK

Paredes:

Concertina:

Puerta:

Chapa:

OK

OK

OK

OK



VISTA PANORAMICA DEL SITE



VISTA PARED PARIMETRICA

II .- SUMINISTRO DE ENERGIA AC:

Tipo de Instalacion:

Nivel de Tensión:

Sistema de Conexión:

N° Suministro:

Aérea

LBT

Monofásica

no visible

PDP:

Estado:

Voltaje 1(VAC):

ITM(A):

TVSS

Corriente 1(AAC):

OK

222

59

OK

8



PDP

III .- SUMINISTRO DE ENERGIA DC:

Gabinete Rectificador:

Estado:

Marca:

Ventiladores:

A/A:

Filtros:

OK

Huawei

OK

OK

OK

Power Core:

Marca:

Modelo:

Controlador:

Modelo:

Voltaje (VDC):

Carga (ADC):

LVBD/BLVD(VDC):

LVLD/LLVD(VDC):

Módulos:

Estado:

Modelo1:

Cantidad1:

Huawei

Huawei

Smu2b

51

24

47

44

OK

R4850G

2

Bancada Total 1:

Estado:

Cantidad:

Voltaje (V):

Marca1:

Modelo1:

Capacidad1(Ah):

Autonomia (Hr):

OK

2

51

otros


Huawei ESM

150

24



Rectificador 1

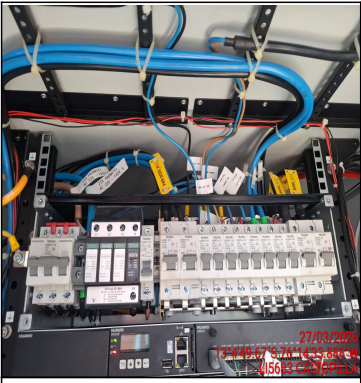


Power Core 1

IV .- GABINETE DE TRANSMISION:

Gabinete Tx1: Estado: OK
Ventiladores: OK
A/A: OK
Filtros: OK
Radios (#): 0
Routers (#): 1
Modem (#): 0
BBU (#): 1
Switch (#): 0
Media Converter (#): 0



Gabinete Tx 1 Abierto

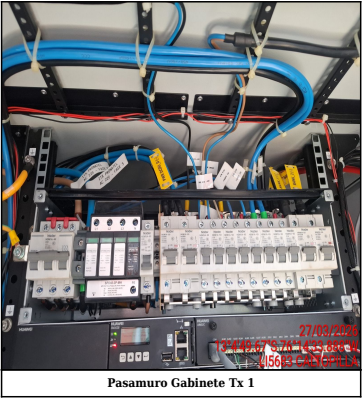

Pasamuro Gabinete Tx 1


V.- BTS:

BBU: Tipo: TDD
Estado: OK
FAN: OK
Cable FO: Estado: OK
Banda 1 (MHz): 3500
Cantidad: 1


VSWR: OK
Alarmas Externas: OK
Alarmas Internas: OK




Panoramica de BBU1

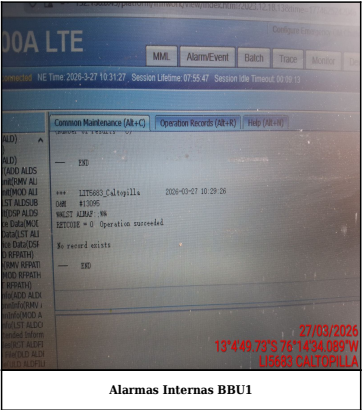


Alarmas Internas BBU1

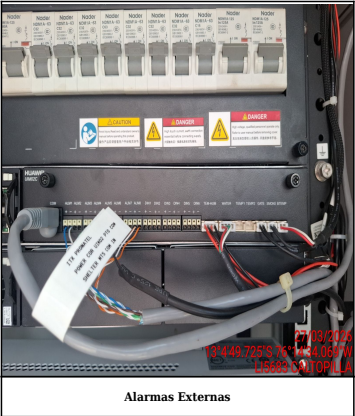

Alarmas Externas

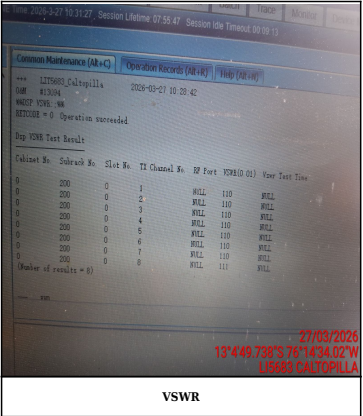

VSWR

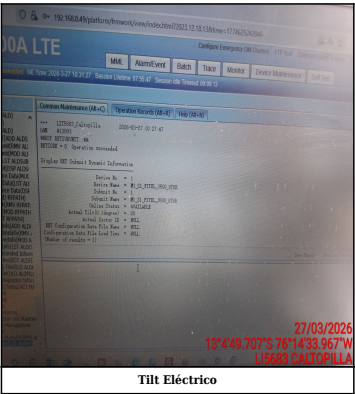

Tilt Electrico

VI.- SISTEMA RADIANTE:

Antenas:

Sectoriales TDD: Estado: OK
Cantidad: 1
Modelo: ATD4518R8q1T
Tilt m.1(°): N/A

Microondas: Estado: OK
Cantidad: 0



Torre



Vulcanizado Conectores S1


RRU Cantidad: 1
Conectores: OK
Cables RF/IF: OK

Luz de Balizaje: Estado: N/A
Cantidad: 0

Pararrayos: Estado: OK



Vulcanizado Conectores S2



Vulcanizado Conectores S3

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado: OK
Tipo: parres
Cantidad: 3
Resistencia (Ω) 1.31
Topología : unico



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

sin observacion

N/A

Observacion 1
