




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías

Nombre de la Estacion: NUEVO IMPERIAL PUEBLO
Nombre de Localidad: NUEVO IMPERIAL
Fecha: 15/04/2026 - 15/04/2026
Direccion: AH 7 DE AGOSTO MZ J LT 4
ID site: LI1076
CRQ: CRQ00000052891

Sticker Año mantenimiento

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

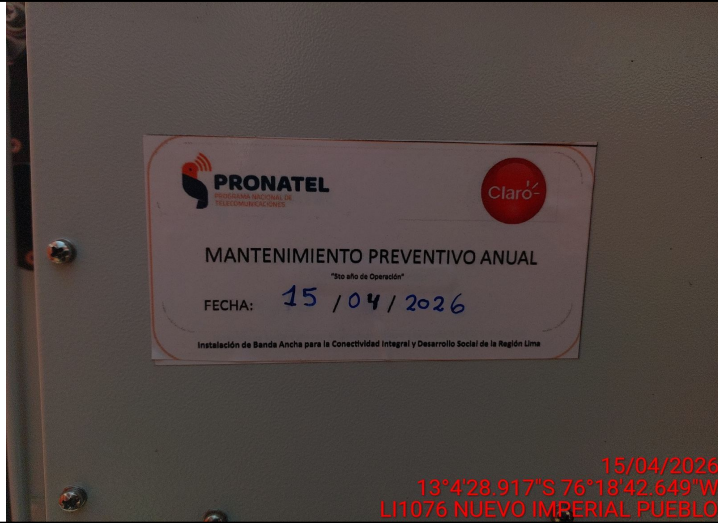


VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES

DURANTE

DESPUES

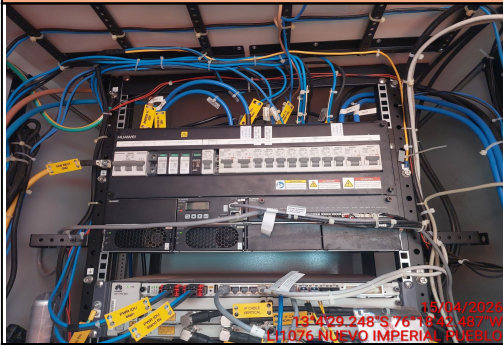

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES

DURANTE

DESPUES






PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS

ANTES

DURANTE

DESPUES

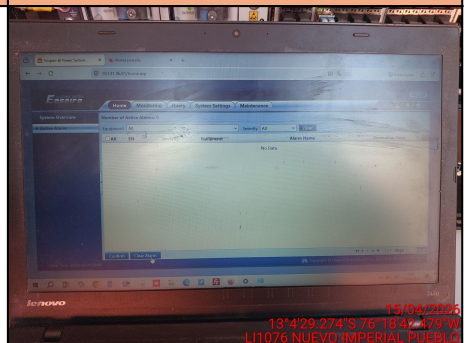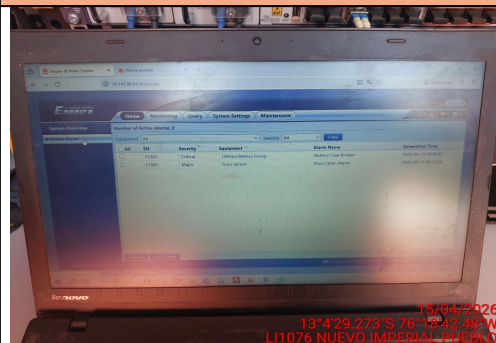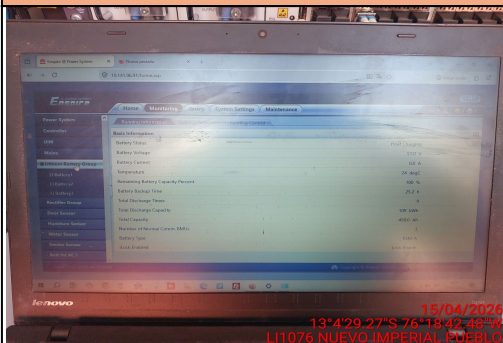

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos
