

ZONA	SANTIAGO DE ANCHUCAYA	NOMBRE SITE:	SANTIAGO_DE_ANCHUCAYA	CODIGO SITE:	LI5240	FECHA :	2026-04-20 22:21:25
CRQ	CRQ000000055227	COORDENADAS	12°5'42.348"S 76°14'0.912"W	TÉCNICO RESPONSABLE	Adrian Paucar		

I .- INFRAESTRUTURA

Site:	Modelo:	Greenfield
	Tipo:	Indoor
Torre:	Tipo:	Autosoportada Triangular
	Estado:	OK
	Altura (m):	25
	Verticalidad:	OK
	Pintura:	OK
	Escalera:	OK
	Línea de vida:	OK
	Cable Vientos:	N/A
	Grapas:	N/A
	Templadores:	N/A
	Base Templadores:	N/A
	Base de Torre:	OK
Paredes:	OK	
Concertina:	OK	
Puerta:	OK	
Chapa:	OK	



VISTA PANORAMICA DEL SITE




VISTA PARED PARIMETRICA

II .- SUMINISTRO DE ENERGIA AC:

Tipo de Instalacion:	Aérea
Nivel de Tensión:	LBT
Sistema de Conexión:	Monofásica
N° Suministro:	NV

PDP:	Estado:	OK
	Voltaje 1(VAC):	218
	ITM(A):	50
	TVSS	OK
	Corriente 1(AAC):	6

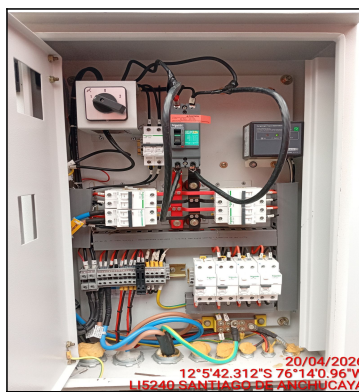


PDP

III .- SUMINISTRO DE ENERGIA DC:

Gabinete Rectificador:	Estado:	OK	
	Marca:	Huawei	
	Ventiladores:	OK	
	A/A:	OK	
	Filtros:	OK	
Power Core:	Marca:	Huawei	
	Modelo:	MTS9000A	
	Controlador:		
		Modelo:	SMU02B
		Voltaje (VDC):	51
		Carga (ADC):	15
		LVBD/BLVD(VDC):	44
		LVLD/LLVD(VDC):	47
		Módulos:	Estado:
		Modelo1:	R4850G
		Cantidad1:	2
Bancada Total 1:	Estado:	OK	
	Cantidad:	3	
	Voltaje (V):	51	
	Marca1:	Huawei	
	Modelo1:	ESM-48150A1	
	Capacidad1(Ah):	150	
	Autonomia (Hr):	28.8	



Rectificador 1

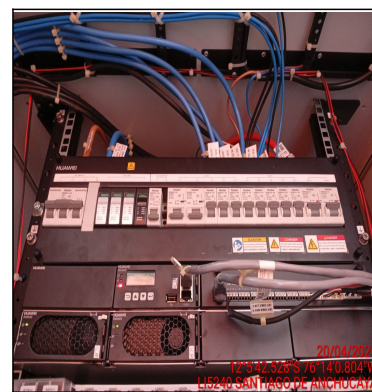

Power Core 1

IV .- GABINETE DE TRANSMISION:

Gabinete Tx1:

Estado:	OK
Ventiladores:	OK
A/A:	OK
Filtros:	OK
Radios (#):	1
Routers (#):	1
Modem (#):	0
BBU (#):	1
Switch (#):	0
Media Converter (#):	0



Gabinete Tx 1 Abierto




Pasamuro Gabinete Tx 1


V.- BTS:

BBU:

Tipo:	BBU5900
Estado:	OK
FAN:	OK
Cable FO:	Estado: OK
	Banda 1 (MHz): 3500
	Cantidad: 1
	VSWR: OK
	Alarmas Externas: OK
	Alarmas Internas: OK

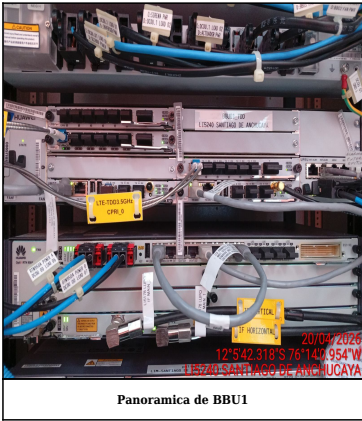


Panoramica de BBU1

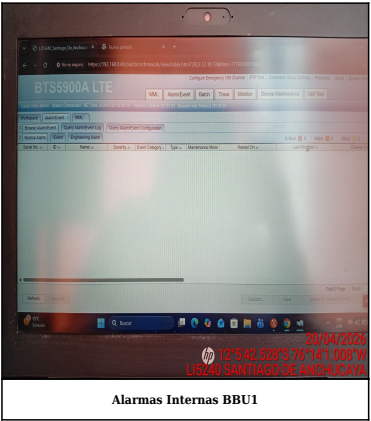


Alarmas Internas BBU1



Alarmas Externas

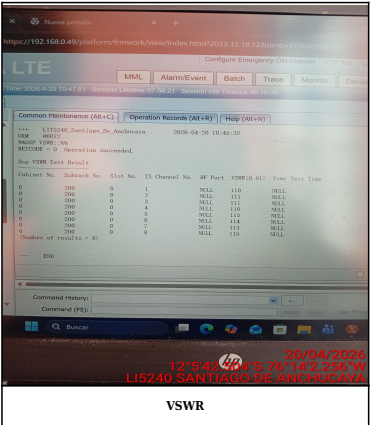

VSWR

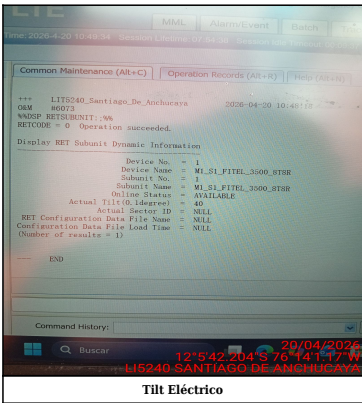

Tilt Eléctrico

VI.- SISTEMA RADIANTE:

Antenas:

Sectoriales TDD: Estado: OK
Cantidad: 1
Modelo: NV
Tilt m.1(*): OK

Microondas: Estado: OK
Cantidad: 1



Torre



Vulcanizado Conectores S1

RRU Cantidad: 1
Conectores: OK
Cables RF/IF: OK

Luz de Balizaje: Estado: N/A
Cantidad: 0

Pararrayos: Estado: OK



Vulcanizado Conectores S2



Vulcanizado Conectores S3

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado: OK
Tipo: Parres
Cantidad: 3
Resistencia (Ω): 1.26
Topologia : Unico



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

OK

N/A

Observacion 1
