

I .- INFRAESTRUCTURA

Site:

Torre:

Paredes:

Concertina:

Puerta:

Chapa:

Modelo:

Tipo:

Tipo:

Estado:

Altura (m):

Verticalidad:

Pintura:

Escalera:

Línea de vida:

Cable Vientos:

Grapas:

Templadores:

Base Templadores:

Base de Torre:

OK

OK

ARRIOSTRADA

OK

20

OK

OK

OK

OK

N/A

N/A

N/A

N/A

OK

OK

OK

OK

GREENFIELD

INDOOR

ARRIOSTRADA

OK

20

OK

OK

OK

OK

N/A

N/A

N/A

N/A

OK

OK

OK

OK



16/04/2026
12°54'3.018"S 75°49'52.013"W
LI5629 HUANGASCAR

VISTA PANORAMICA DEL SITE



16/04/2026
12°54'2.676"S 75°49'52.356"W
LI5629 HUANGASCAR

VISTA PARED PARIMETRICA

II .- SUMINISTRO DE ENERGIA AC:

Tipo de Instalacion:

Nivel de Tensión:

Sistema de Conexión:

N° Suministro:

PDP:

Aérea

LBT

Monofásica

NA

Estado:

Voltaje 1(VAC):

ITM(A):

TVSS

Corriente 1(AAC):

OK

227

50

OK

4.65



16/04/2026
12°54'2.844"S 75°49'52.308"W
LI5629 HUANGASCAR

PDP

III .- SUMINISTRO DE ENERGIA DC:

Gabinete Rectificador:

Power Core:

Bancada Total 1:

Estado:

Marca:

Modelo:

Controlador:

Módulos:

Estado:

Modelo1:

Cantidad1:

OK

HUAWEI

ETP-48200A

Modelo:

Voltaje (VDC):

Carga (ADC):

LVBD/BLVD(VDC):

LVLD/LLVD(VDC):

SMU02B

51

16.3

46

47

OK

R4850G

2

OK

3

51

HUAWEI

ESM-48150A1

150

23



16/04/2026
12°54'2.795"S 75°49'52.955"W
LI5629 HUANGASCAR

Rectificador 1



16/04/2026
12°54'2.795"S 75°49'52.955"W
LI5629 HUANGASCAR

Power Core 1

IV .- GABINETE DE TRANSMISION:

Gabinete Tx1:

Estado:

Ventiladores:

A/A:

Filtros:

Radios (#):

Routers (#):

Modem (#):

BBU (#):

Switch (#):

Media Converter (#):

OK

OK

OK

OK

1

1

0


1

0

0



Gabinete Tx 1 Abierto

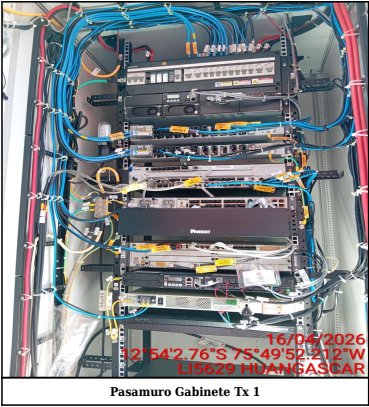

Pasamuro Gabinete Tx 1

V .- BTS:

BBU:

Tipo:

Estado:

FAN:

Cable FO:

BBU5900

OK

OK

Estado: OK

Banda 1 (MHz): 3500

Cantidad: 1


VSWR: OK

Alarmas Externas: OK

Alarmas Internas: OK




Panoramica de BBU1

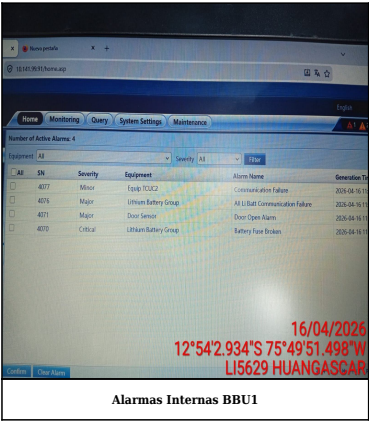


Alarmas Internas BBU1



Alarmas Externas

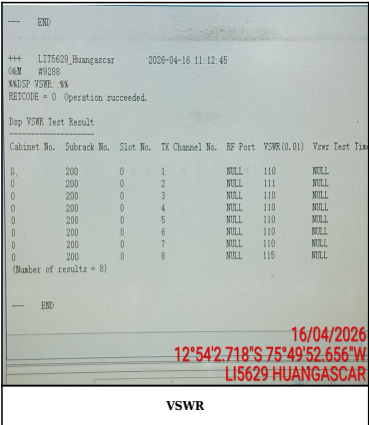

VSWR

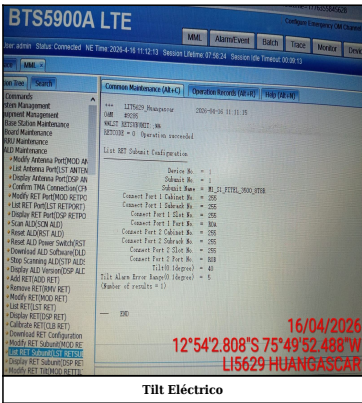

Tilt Eléctrico

VI .- SISTEMA RADIANTE:

Antenas:

Sectoriales TDD: Estado: OK
Cantidad: 1
Modelo: ATD
Tilt m.1(*): OK

Microondas: Estado: OK
Cantidad: 1




Torre



Vulcanizado Conectores S1



Vulcanizado Conectores S2



Vulcanizado Conectores S3

RRU Cantidad: 1
Conectores: OK
Cables RF/IF: OK

Luz de Balizaje: Estado: N/A
Cantidad: 0

Pararrayos: Estado: OK

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado: OK
Tipo: malla
Cantidad: 2
Resistencia (Ω): 2.9
Topologia : horizontal



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

NA

N/A

Observacion 1
