

ZONA	MADEAN	NOMBRE SITE:	ORTIGAL	CODIGO SITE:	LI5750	FECHA :	2026-05-08 01:35:45
CRQ	CRQ000000064622	COORDENADAS	12°	TÉCNICO RESPONSABLE	Alcides Guevara		

I .- INFRAESTRUCTURA

Site: Modelo: GREENFIELD Tipo: OUTDOOR Torre: Tipo: AUTOSOPORTADA Estado: OK Altura (m): 25 Verticalidad: OK Pintura: OK Escalera: OK Línea de vida: OK Cable Vientos: N/A Grapas: N/A Templadores: N/A Base Templadores: N/A Base de Torre: OK Paredes: OK Concertina: OK Puerta: OK Chapa: OK	 VISTA PANORAMICA DEL SITE	 VISTA PARED PERIMETRICA
---	--	---

II .- SUMINISTRO DE ENERGIA AC:

Tipo de Instalacion: Aérea Nivel de Tensión: LBT Sistema de Conexión: Monofásica N° Suministro: NA PDP: Estado: OK Voltaje 1(VAC): 227 ITM(A): 32 TVSS: OK Corriente 1(AAC): 4.6	 PDP
---	---

III .- SUMINISTRO DE ENERGIA DC:

Gabinete Rectificador: Estado: OK Marca: HUAWEI Ventiladores: OK A/A: OK Filtros: OK Power Core: Marca: HUAWEI Modelo: ETP-48200A Controlador: Modelo: SMU02B Voltaje (VDC): 51 Carga (ADC): 14.2 LVBD/BLVD(VDC): 41 LVLVD/LLVD(VDC): 46 Módulos: Estado: OK Modelo1: R4850G Cantidad1: 2 Bancada Total 1: Estado: OK Cantidad: 2 Voltaje (V): 51 Marca1: HUAWEI Modelo1: ESM-48150A1 Capacidad1(Ah): 150 Autonomia (Hr): 27	 Rectificador 1	 Power Core 1
---	---	--

IV .- GABINETE DE TRANSMISION:

Gabinete Tx1:

Estado:	OK
Ventiladores:	OK
A/A:	OK
Filtros:	OK
Radios (#):	1
Routers (#):	1
Modem (#):	0
BBU (#):	1
Switch (#):	0
Media Converter (#):	0



Gabinete Tx 1 Abierto



Pasamuro Gabinete Tx 1


V.- BTS:

BBU:

Tipo:	BBU5900
Estado:	OK
FAN:	OK
Cable FO:	Estado: OK
	Banda 1 (MHz): 3500
	Cantidad: 1
	VSWR: OK
	Alarmas Externas: OK
	Alarmas Internas: OK




Panoramica de BBU1

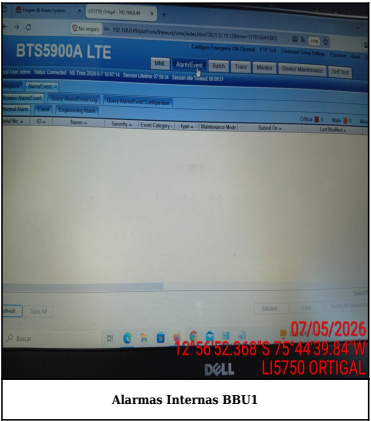


Alarmas Internas BBU1



Alarmas Externas

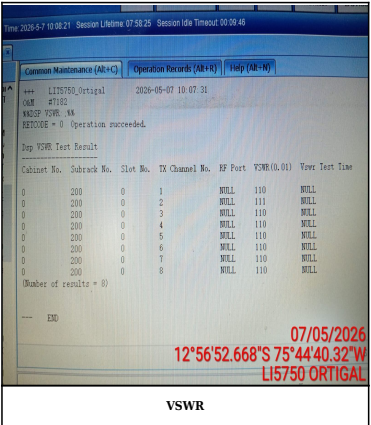

VSWR

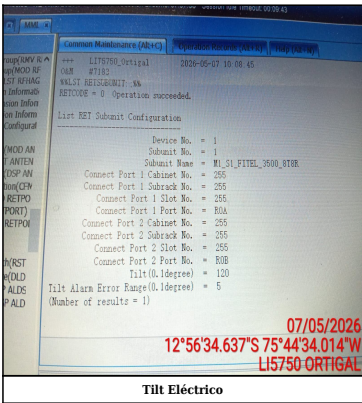

Tilt Eléctrico

VI.- SISTEMA RADIANTE:

Antenas:

Sectoriales TDD:

Estado:
Cantidad:
Modelo:
Tilt m.1(°):

OK
1
ATD
OK

Microondas:

Estado:
Cantidad:

OK
1

RRU

Cantidad:
Conectores:
Cables RF/IF:

1
OK
OK

Luz de Balizaje:

Estado:
Cantidad:

N/A
0

Pararrayos:

Estado:

OK




Torre



Vulcanizado Conectores S1



Vulcanizado Conectores S2



Vulcanizado Conectores S3

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado:

Tipo:

Cantidad:

Resistencia (Ω)

Topologia :

OK
malla
3
2.43
horizontal



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

NA

N/A

Observacion 1
