

ZONA	PACARAOS	NOMBRE SITE:	PACARAOS	CODIGO SITE:	LI5144	FECHA :	2026-05-10 01:42:44
CRQ	CRQ000000064334	COORDENADAS	11°11'19.848"S 76°38'57.736"W	TÉCNICO RESPONSABLE	Jesus Ramos		

I.- INFRAESTRUCTURA

Site:	Modelo:	GREENFIELD
	Tipo:	OUTDOOR
Torre:	Tipo:	AUTOSOPORTADA
	Estado:	OK
	Altura (m):	45
	Verticalidad:	OK
	Pintura:	OK
	Escalera:	OK
	Línea de vida:	OK
	Cable Vientos:	N/A
	Grapas:	N/A
	Templadores:	N/A
	Base Templadores:	N/A
	Base de Torre:	OK
Paredes:	OK	
Concertina:	OK	
Puerta:	OK	
Chapa:	OK	



VISTA PANORAMICA DEL SITE




VISTA PARED PARIMETRICA

II.- SUMINISTRO DE ENERGIA AC:

Tipo de Instalacion:	Aérea
Nivel de Tensión:	LBT
Sistema de Conexión:	Monofásica
Nº Suministro:	NV


PDP:	Estado:	OK
	Voltaje 1(VAC):	0
	ITM(A):	50
	TVSS	OK
	Corriente 1(AAC):	0

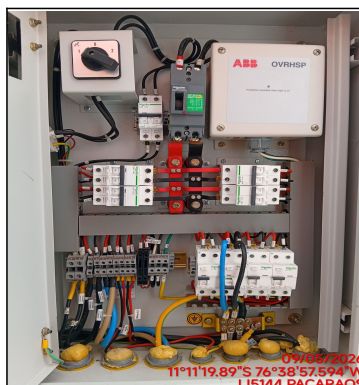

PDP

III .- SUMINISTRO DE ENERGIA DC:

Gabinete Rectificador:	Estado:	OK	
	Marca:	HUAWEI	
	Ventiladores:	OK	
	A/A:	OK	
	Filtros:	OK	
Power Core:	Marca:	HUAWEI	
	Modelo:	HUAWEI	
	Controlador:		
	Modelo:	SMU02B	
	Voltaje (VDC):	51	
	Carga (ADC):	20	
	LVBD/BLVD(VDC):	35	
	LVLD/LLVD(VDC):	34	
	Módulos:	Estado:	OK
		Modelo1:	R4850G
	Cantidad1:	3	
Bancada Total 1:	Estado:	OK	
	Cantidad:	3	
	Voltaje (V):	51	
	Marca1:	HUAWEI	
	Modelo1:	ESM-48150A1	
	Capacidad1(Ah):	150	
	Autonomía (Hr):	6	

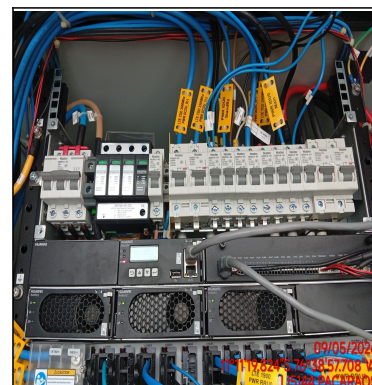
**Rectificador 1****Power Core 1**

IV .- GABINETE DE TRANSMISION:

Gabinete Tx1:	Estado:	OK
	Ventiladores:	OK
	A/A:	OK
	Filtros:	OK
	Radio (#):	0
	Router (#):	1
	Modem (#):	0
	BBU (#):	1
	Switch (#):	0
	Media Converter (#):	1



Gabinete Tx 1 Abierto

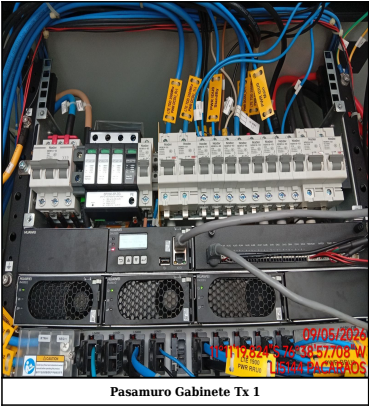


Pasamuro Gabinete Tx 1

V .- BTS:

BBU:	Tipo:	BBU5900
	Estado:	OK
	FAN:	OK
	Cable FO:	Estado: OK
		Banda 1 (MHz): 0
		Cantidad: 0
	VSWR:	OK
	Alarmas Externas:	OK
	Alarmas Internas:	OK




Panoramica de BBU1

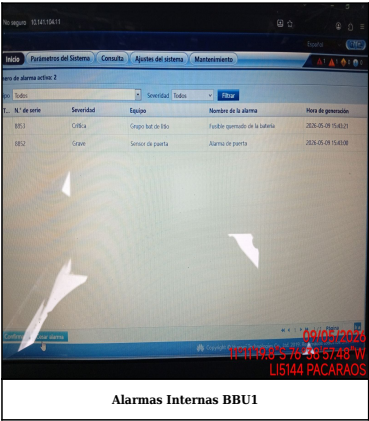

Alarmas Internas BBU1



Alarmas Externas

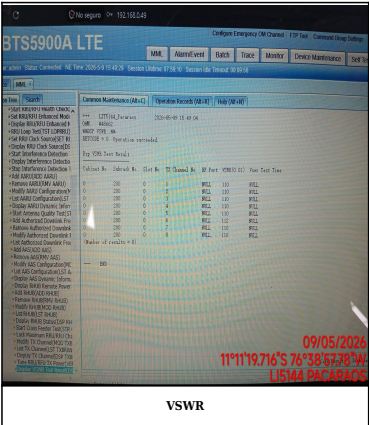

VSWR



Tilt Eléctrico

VI .- SISTEMA RADIANTE:


Antenas:

Sectoriales TDD: Estado: OK
Cantidad: 2
Modelo: NV
Tilt m.1(*): OK

Microondas: Estado: OK
Cantidad: 5




Torre



Vulcanizado Conectores S1



Vulcanizado Conectores S2



Vulcanizado Conectores S3

RRU Cantidad: 7
Conectores: OK
Cables RF/IF: OK

Luz de Balizaje: Estado: OK
Cantidad: 1

Pararrayos: Estado: OK

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado: OK
Tipo: PARREL
Cantidad: 3
Resistencia (Ω): 3
Topologia : MALLA



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

NA

N/A

Observacion 1
