




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A

Nombre de la Estación: APURI
Nombre de Localidad: VIÑAC
Fecha: 18/05/2026 - 18/05/2026
Dirección: CP VIÑAC
ID site: LI5650
CRQ: CRQ000000070545

Sticker Año mantenimiento




Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

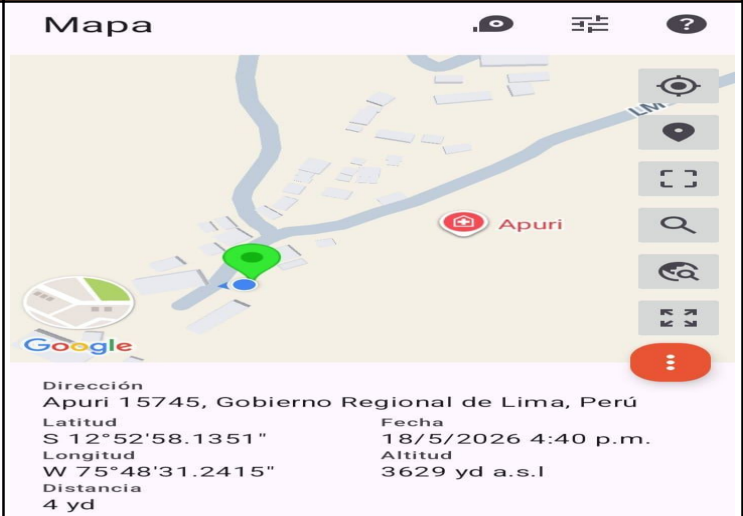


VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES

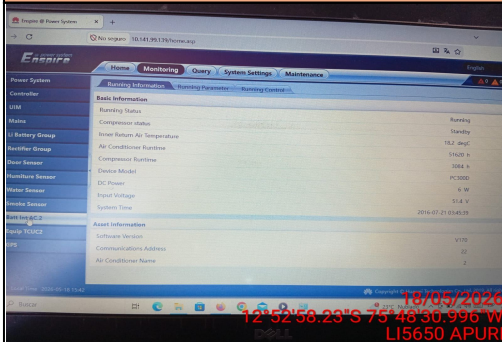

DURANTE

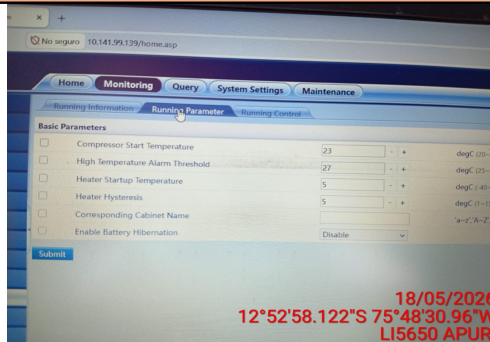

DESPUES



LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR


ANTES



DURANTE



DESPUES

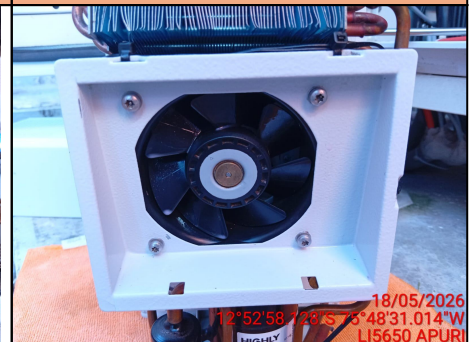

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES



DURANTE



DESPUES



REVISION DE TARJETAS DE CONTROL		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 18/05/2026 12°52'58.332"S 75°48'31.134"W LI5650 APURI	 18/05/2026 12°52'58.242"S 75°48'31.062"W LI5650 APURI	 18/05/2026 12°52'58.158"S 75°48'30.918"W LI5650 APURI
REVISION DE COMPRESOR Y RESISTENCIA ELECTRICA		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 18/05/2026 12°52'58.326"S 75°48'31.116"W LI5650 APURI	 18/05/2026 12°52'58.206"S 75°48'31.032"W LI5650 APURI	 18/05/2026 12°52'58.062"S 75°48'31.02"W LI5650 APURI

CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales
