

ZONA	CAUJUL	NOMBRE SITE:	CAUJUL_FITEL	CODIGO SITE:	LI5474	FECHA :	2026-05-20 03:59:41
CRQ	CRQ000000070262	COORDENADAS		TÉCNICO RESPONSABLE	Jesus Espinoza		


I .- INFRAESTRUCTURA

Site:	Modelo:	greenfield		
	Tipo:	indoor		
Torre:	Tipo:	AUTOSOPORTADA		
	Estado:	OK		
	Altura (m):	20		
	Verticalidad:	OK		
	Pintura:	OK		
	Escalera:	OK		
	Línea de vida:	OK		
	Cable Vientos:	N/A		
	Grapas:	N/A		
	Templadores:	N/A		
	Base Templadores:	N/A		
	Base de Torre:	OK		
Paredes:	OK			
Concertina:	OK			
Puerta:	OK			
Chapa:	OK			

II .- SUMINISTRO DE ENERGIA AC:

Tipo de Instalacion:	Aérea	
Nivel de Tensión:	LBT	
Sistema de Conexión:	Monofásica	
N° Suministro:	nv	
PDP:	Estado:	OK
	Voltaje 1(VAC):	218
	ITM(A):	50
	TVSS	OK
	Corriente 1(AAC):	8

III .- SUMINISTRO DE ENERGIA DC:

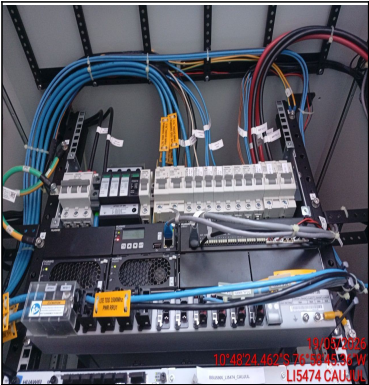Gabinete Rectificador:	Estado:	OK		
	Marca:	Huawei		
	Ventiladores:	OK		
	A/A:	OK		
	Filtros:	OK		
Power Core:	Marca:	Huawei		
	Modelo:	MST9000A		
	Controlador:	Modelo: SMU02B		
		Voltaje (VDC): 51		
		Carga (ADC): 11		
		LVBD/BLVD(VDC):45		
		LVLd/LLVD(VDC): 47		
	Módulos:	Estado: OK		
		Modelo1: R4850G		
		Cantidad1: 2		
Bancada Total 1:	Estado:	OK		
	Cantidad:	1		
	Voltaje (V):	51		
	Marca1:	Huawei		
	Modelo1:	ESM48150A1		
	Capacidad1(Ah):	150		
	Autonomia (Hr):	19		


IV .- GABINETE DE TRANSMISION:

Gabinete Tx1:

Estado:	OK
Ventiladores:	OK
A/A:	OK
Filtros:	OK
Radio (#):	1
Router (#):	0
Modem (#):	1
BBU (#):	1
Switch (#):	1
Media Converter (#):	1



Gabinete Tx 1 Abierto

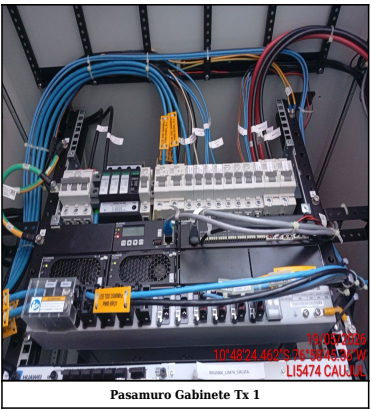

Pasamuro Gabinete Tx 1


V .- BTS:

BBU:


Tipo:	5900
Estado:	OK
FAN:	OK
Cable FO:	Estado: OK
	Banda 1 (MHz): 3500
	Cantidad: 1
	VSWR: OK
	Alarmas Externas: OK
	Alarmas Internas: OK




Panorámica de BBU1

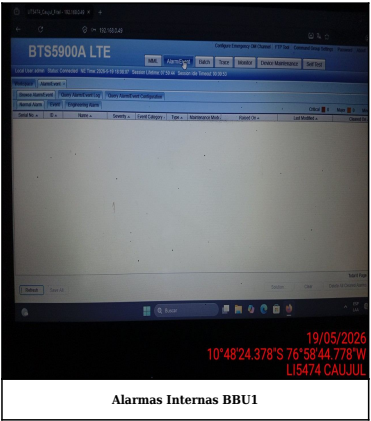


Alarmas Internas BBU1

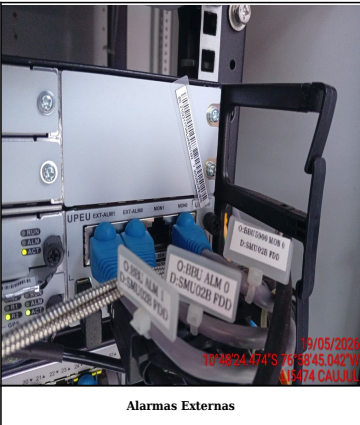

Alarmas Externas

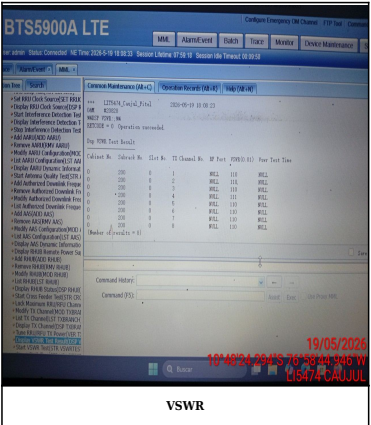

VSWR

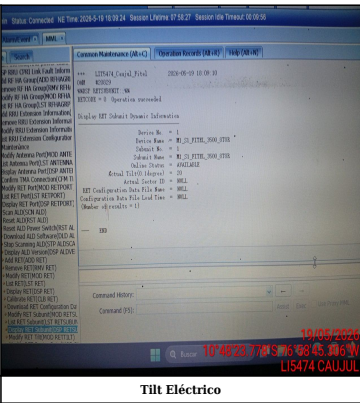

Tilt Eléctrico

VI .- SISTEMA RADIANTE:

Antenas:

Sectoriales TDD:	Estado:	OK
	Cantidad:	2
	Modelo:	nv
	Tilt m.1(°):	OK

Microondas:	Estado:	OK
	Cantidad:	1



Torre



Vulcanizado Conectores S1

RRU	Cantidad:	1
	Conectores:	OK
	Cables RF/IF:	OK

Luz de Balizaje:	Estado:	N/A
	Cantidad:	0

Pararrayos:	Estado:	OK
-------------	---------	----



Vulcanizado Conectores S2



Vulcanizado Conectores S3

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado:	OK
Tipo:	unico
Cantidad:	1
Resistencia (Ω)	2.31
Topologia :	único



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

n.a

N/A

Observacion 1
