

ZONA	IHUARI	NOMBRE SITE:	NAUPAY	CODIGO SITE:	LI5141	FECHA :	2026-05-22 21:04:07
CRQ	CRQ000000070601	COORDENADAS	11°14'3.696"S 76°55'29.869"W	TÉCNICO RESPONSABLE	Jesus Ramos		

I .- INFRAESTRUCTURA

Site:	Modelo:	GREENFIELD			
	Tipo:	OUTDOOR			
Torre:	Tipo:	AUTOSOPORTADA			
	Estado:	OK			
	Altura (m):	30			
	Verticalidad:	OK			
	Pintura:	OK			
	Escalera:	OK			
	Línea de vida:	OK			
	Cable Vientos:	N/A			
	Grapas:	N/A			
	Templadores:	N/A			
	Base Templadores:	N/A			
	Base de Torre:	OK			
Paredes:	OK				
Concertina:	OK				
Puerta:	OK				
Chapa:	OK				


20/06/2026
10°44'23.78"S 85°51'02.94"W
LISTA TORRE

VISTA PANORAMICA DEL SITE


20/06/2026
10°15'21.84"S 74°41'07.85"W
LISTA SANTAGO DE CHIQUE

VISTA PARED PERIMETRICA

II .- SUMINISTRO DE ENERGIA AC:

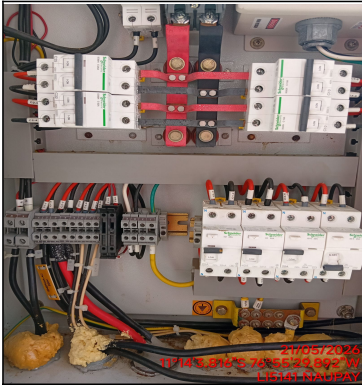Tipo de Instalacion:	Aérea	
Nivel de Tensión:	LMT	
Sistema de Conexión:	Monofásica	
N° Suministro:	NA	
PDP:	Estado:	OK
	Voltaje 1(VAC):	0
	ITM(A):	0
	TVSS	OK
	Corriente 1(AAC):	0

III .- SUMINISTRO DE ENERGIA DC:

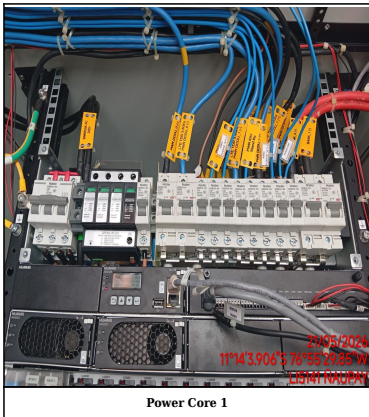
Gabinete Rectificador:	Estado:	OK			
	Marca:	HUAWEI			
	Ventiladores:	OK			
	A/A:	OK			
	Filtros:	OK			
Power Core:	Marca:	HUAWEI			
	Modelo:	HUAWEI			
	Controlador:				
	Modelo:	SMU02B			
	Voltaje (VDC):	51			
	Carga (ADC):	20			
	LVBD/BLVD(VDC):	43			
	LVLDD/LLVD(VDC):	46			
	Módulos:	Estado:	OK		
		Modelo1:	R4850G		
		Cantidad1:	2		
Bancada Total 1:	Estado:	OK			
	Cantidad:	2			
	Voltaje (V):	51			
	Marca1:	OTROS			
	Modelo1:	ESM-48150A1			
	Capacidad1(Ah):	150			
	Autonomia (Hr):	6			

IV .- GABINETE DE TRANSMISION:

Gabinete Tx1: Estado: OK
Ventiladores: OK
A/A: OK
Filtros: OK
Radios (#): 0
Routers (#): 1
Modem (#): 0
BBU (#): 1
Switch (#): 0
Media Converter (#): 1



Gabinete Tx 1 Abierto

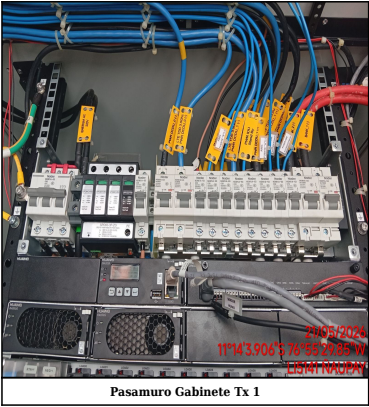


Pasamuro Gabinete Tx 1


V.- BTS:

BBU: Tipo: 5900
Estado: OK
FAN: OK
Cable FO: Estado: OK
Banda 1 (MHz): 0
Cantidad: 0

VSWR: OK
Alarmas Externas: OK
Alarmas Internas: OK

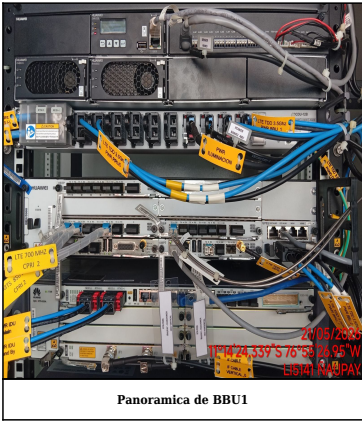


Panoramica de BBU1

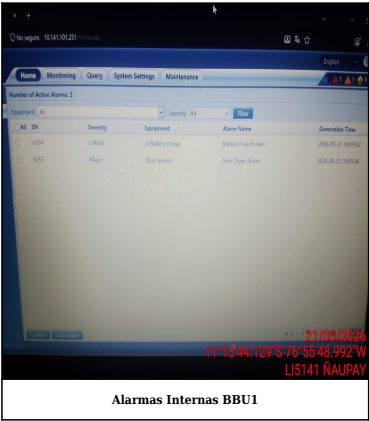

Alarmas Internas BBU1



Alarmas Externas

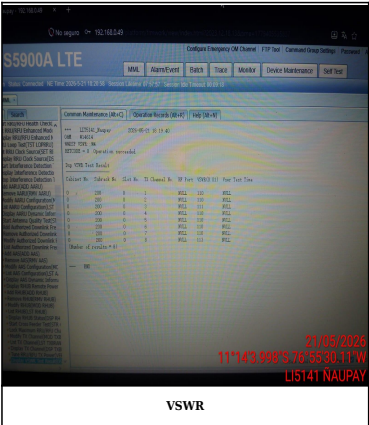

VSWR



Tilt Eléctrico

VI.- SISTEMA RADIANTE:

Antenas:

Sectoriales TDD: Estado: OK
Cantidad: 3
Modelo: NV
Tilt m.1(*): OK

Microondas: Estado: OK
Cantidad: 1



Torre

N/A

Vulcanizado Conectores S1

N/A

Vulcanizado Conectores S2

N/A

Vulcanizado Conectores S3

RRU Cantidad: 2
Conectores: OK
Cables RF/IF: OK

Luz de Balizaje: Estado: OK
Cantidad: 1

Pararrayos: Estado: OK

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado: OK
Tipo: PARREL
Cantidad: 3
Resistencia (Ω) 3
Topologia : MALLA



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

NINGUNA

N/A

Observacion 1
