

ZONA	PATIVILCA	NOMBRE SITE:	HUAYTO	CODIGO SITE:	LI3901	FECHA :	2026-05-23 13:12:18
CRQ	CRQ000000070602	COORDENADAS	10°41'00" S, 77°45'36W	TÉCNICO RESPONSABLE	Anderson Mejia		

I.- INFRAESTRUCTURA

Site:	Modelo:	Greenfield
	Tipo:	indoor
Torre:	Tipo:	autosoportada triangular
	Estado:	OK
	Altura (m):	25
	Verticalidad:	OK
	Pintura:	OK
	Escalera:	OK
	Línea de vida:	OK
	Cable Vientos:	N/A
	Grapas:	N/A
	Templadores:	N/A
	Base Templadores:	N/A
	Base de Torre:	OK
Paredes:	OK	
Concertina:	OK	
Puerta:	OK	
Chapa:	OK	



VISTA PANORAMICA DEL SITE



VISTA PARED PARIMETRICA

II.- SUMINISTRO DE ENERGIA AC:

Tipo de Instalacion:	Súbterranea	
Nivel de Tensión:	LBT	
Sistema de Conexión:	Monofásica	
N° Suministro:	0	
PDP:	Estado:	OK
	Voltaje 1(VAC):	224.3
	ITM(A):	50
	TVSS	OK
	Corriente 1(AAC):	14.8



PDP

III.- SUMINISTRO DE ENERGIA DC:

Gabinete Rectificador:	Estado:	OK	
	Marca:	Huawei	
	Ventiladores:	OK	
	A/A:	OK	
	Filtros:	OK	
Power Core:	Marca:	Huawei	
	Modelo:	MTS9000A	
	Controlador:		
		Modelo:	SMU02B
		Voltaje (VDC):	51
		Carga (ADC):	17.2
		LVBD/BLVD(VDC):	43.5
		LVLVD/LLVD(VDC):	47
		Módulos:	
		Estado:	OK
Bancada Total 1:		Modelo1:	R4850G
		Cantidad1:	2
	Estado:	OK	
	Cantidad:	3	
	Voltaje (V):	51	
	Marca1:	otros	
	Modelo1:	ESM48150A	
	Capacidad1(Ah):	150	
	Autonomia (Hr):	19	



Rectificador 1



Power Core 1

IV.- GABINETE DE TRANSMISION:

Gabinete Tx1:

Estado:

Ventiladores:

A/A:

Filtros:

Radios (#):

Routers (#):

Modem (#):

BBU (#):

Switch (#):

Media Converter (#):

OK

OK

OK

OK

1

0

0

1

0

0



Gabinete Tx 1 Abierto



Pasamuro Gabinete Tx 1

V .- BTS:

BBU:

Tipo:

Estado:

FAN:

Cable FO:

TDD

OK

OK

Estado:

Banda 1 (MHz):

Cantidad:

3500

1

VSWR:

Alarmas Externas:

Alarmas Internas:


OK

OK

OK




Panoramica de BBU1

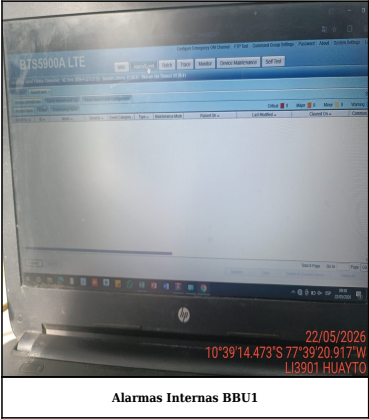


Alarmas Internas BBU1



Alarmas Externas

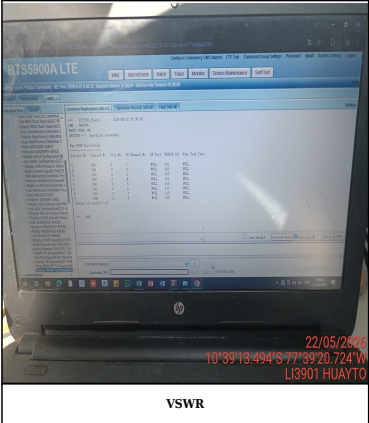

VSWR

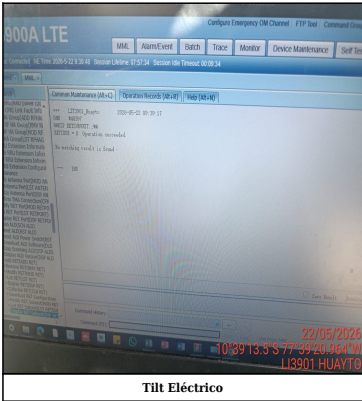

Tilt Eléctrico

VI .- SISTEMA RADIANTE:

Antenas:

Sectoriales TDD: Estado: OK
Cantidad: 2
Modelo: n.v
Tilt m.1(°): N/A

Microondas: Estado: OK
Cantidad: 1



Torre



Vulcanizado Conectores S1



Vulcanizado Conectores S2



Vulcanizado Conectores S3

RRU Cantidad: 1
Conectores: OK
Cables RF/IF: OK

Luz de Balizaje: Estado: OK
Cantidad: 1

Pararrayos: Estado: OK

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado: OK
Tipo: parres
Cantidad: 3
Resistencia (Ω) 1.46
Topologia : malla



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

n.a

N/A

Observacion 1
