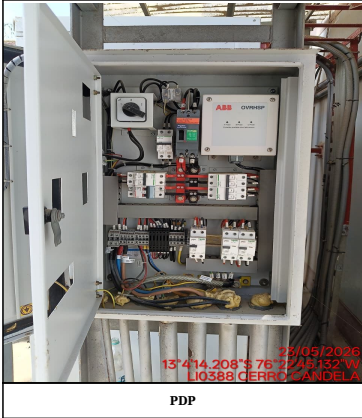


ZONA	SAN VICENTE DE CANETE	NOMBRE SITE:	CERRO_CANDELA	CODIGO SITE:	LI0388	FECHA :	2026-05-25 21:26:19
CRQ	CRQ000000000000	COORDENADAS	13°4'14.064"S 76°22'45.386"W	TÉCNICO RESPONSABLE	Jesus Casas		


I .- INFRAESTRUCTURA

Site:	Modelo:	Greenfield		
	Tipo:	outdoor		
Torre:	Tipo:	autosoportada		
		cuadrangular		
	Estado:	OK		
	Altura (m):	25		
	Verticalidad:	OK		
	Pintura:	OK		
	Escalera:	OK		
	Línea de vida:	OK		
	Cable Vientos:	N/A		
Paredes:	Grapas:	N/A	VISTA PANORAMICA DEL SITE	VISTA PARED PARIMETRICA
	Templadores:	N/A		
	Base Templadores:	N/A		
	Base de Torre:	OK		
Concertina:	OK			
Puerta:	OK			
Chapa:	OK			

II .- SUMINISTRO DE ENERGIA AC:

Tipo de Instalacion:	Aérea	
Nivel de Tensión:	LBT	
Sistema de Conexión:	Monofásica	
N° Suministro:	0	
PDP:	Estado:	OK
	Voltaje 1(VAC):	212
	ITM(A):	50
	TVSS	OK
	Corriente 1(AAC):	11

III .- SUMINISTRO DE ENERGIA DC:

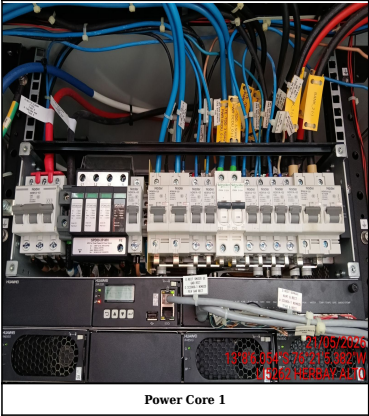Gabinete Rectificador:	Estado:	OK		
	Marca:	Huawei		
	Ventiladores:	OK		
	A/A:	OK		
	Filtros:	OK		
Power Core:	Marca:	Huawei		
	Modelo:	Huawei		
	Controlador:			
	Modelo:	SMU2B		
	Voltaje (VDC):	51		
	Carga (ADC):	24		
	LVBD/BLVD(VDC):	44		
	LULD/LLVD(VDC):	47		
	Módulos:	Estado:	OK	
		Modelo1:	R4850G	
Bancada Total 1:	Cantidad1:	2	Rectificador 1	Power Core 1
	Estado:	OK		
	Cantidad:	2		
	Voltaje (V):	51		
	Marca1:	otros		
	Modelo1:	HUAWEI ESM 48		
	Capacidad1(Ah):	150		
	Autonomía (Hr):	20		

IV .- GABINETE DE TRANSMISION:

Gabinete Tx1:

Estado:

Ventiladores:

A/A:

Filtros:

Radios (#):

Routers (#):

Modem (#):

BBU (#):

Switch (#):

Media Converter (#):

OK

OK

OK

OK

1



1

0

0

0

0

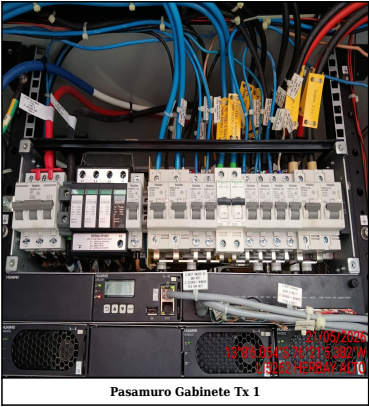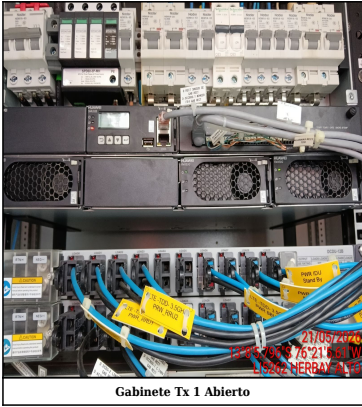

V .- BTS:

BBU:

Tipo:

Estado:

FAN:

Cable FO:

NA

N/A

N/A

Estado:

Banda 1 (MHz):

Cantidad:

VSWR:

Alarmas Externas:

Alarmas Internas:

N/A





0

0

N/A

OK

N/A

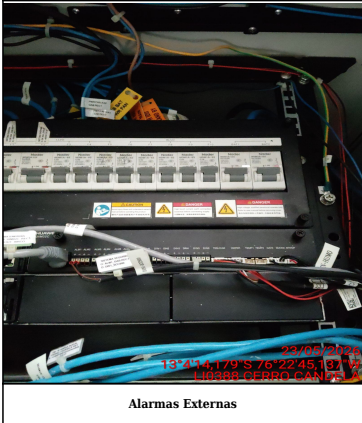

VI .- SISTEMA RADIANTE:

Antenas:

Sectoriales TDD: Estado: N/A
Cantidad: 0
Modelo: NA
Tilt m.1(°): N/A

Microondas: Estado: OK
Cantidad: 2



Torre



Vulcanizado Conectores S1

RRU Cantidad: 1
Conectores: OK
Cables RF/IF: OK

Luz de Balizaje: Estado: N/A
Cantidad: 0

Pararrayos: Estado: OK



Vulcanizado Conectores S2



Vulcanizado Conectores S3

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado: OK
Tipo: parres
Cantidad: 3
Resistencia (Ω) 2.22
Topologia : unico



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

Na

N/A

Observacion 1
