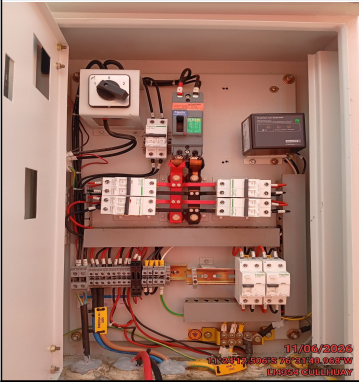


ZONA	HUAROS	NOMBRE SITE:	CULLHUAY	CODIGO SITE:	LI4354	FECHA :	2026-06-11 16:35:19
CRQ	CRQ00000081433	COORDENADAS		TÉCNICO RESPONSABLE	Milton		



I .- INFRAESTRUCTURA

Site:	Modelo:	GREENFIELD		
	Tipo:	OUTDOOR		
Torre:	Tipo:	AUTOSOPORTADA TRIANGULAR		
	Estado:	OK		
	Altura (m):	25		
	Verticalidad:	OK		
	Pintura:	OK		
	Escalera:	OK		
	Línea de vida:	OK		
	Cable Vientos:	N/A		
	Grapas:	N/A		
	Templadores:	N/A		
	Base Templadores:	N/A		
	Base de Torre:	OK		
Paredes:	OK			
Concertina:	OK			
Puerta:	OK			
Chapa:	OK			

II .- SUMINISTRO DE ENERGIA AC:

Tipo de Instalacion:	Súbterranea	
Nivel de Tensión:	LBT	
Sistema de Conexión:	Monofásica	
N° Suministro:	0	
PDP:	Estado:	OK
	Voltaje 1(VAC):	220
	ITM(A):	50
	TVSS	N/A
	Corriente 1(AAC):	0

III .- SUMINISTRO DE ENERGIA DC:

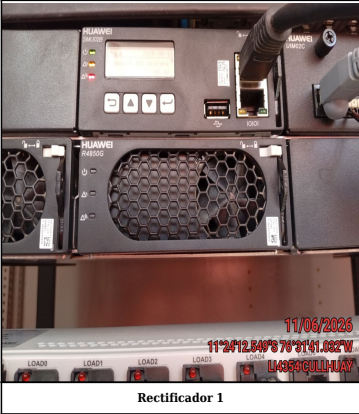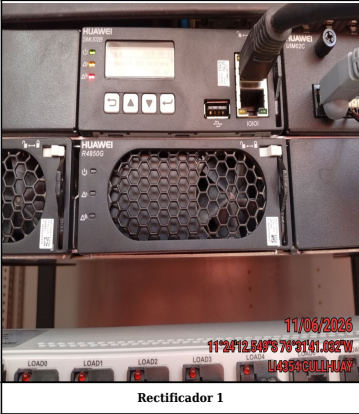Gabinete Rectificador:	Estado:	OK		
	Marca:	HUAWEI		
	Ventiladores:	OK		
	A/A:	OK		
	Filtros:	OK		
Power Core:	Marca:	HUAWEI		
	Modelo:	HUAWEI		
	Controlador:			
	Modelo:	SMU02B		
	Voltaje (VDC):	51		
	Carga (ADC):	16.2		
	LVBD/BLVD(VDC):	43		
	LVLD/LLVD(VDC):	46		
	Módulos:	Estado:	OK	
		Modelo1:	R4850G	
		Cantidad1:	2	
Bancada Total 1:	Estado:	OK		
	Cantidad:	2		
	Voltaje (V):	51		
	Marca1:	HUAWEI		
	Modelo1:	ESM-48150A1		
	Capacidad1(Ah):	150		
	Autonomia (Hr):	4		

IV .- GABINETE DE TRANSMISION:

Gabinete Tx1:

Estado:

Ventiladores:

A/A:

Filtros:

Radios (#):

Routers (#):

Modem (#):

BBU (#):

Switch (#):

Media Converter (#):

OK

OK

OK

OK

1

1

0

1

0

0



Gabinete Tx 1 Abierto



Pasamuro Gabinete Tx 1

V.- BTS:

BBU:

Tipo:

Estado:

FAN:

Cable FO:

TDD

OK

OK

Estado:

Banda 1 (MHz):

Cantidad:

OK

3.5

1

VSWR:

Alarmas Externas:

Alarmas Internas:


OK

OK


OK




Panoramica de BBU1

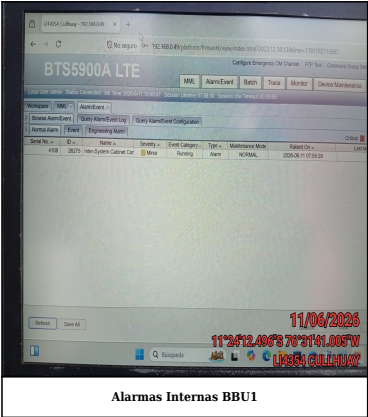


Alarmas Internas BBU1

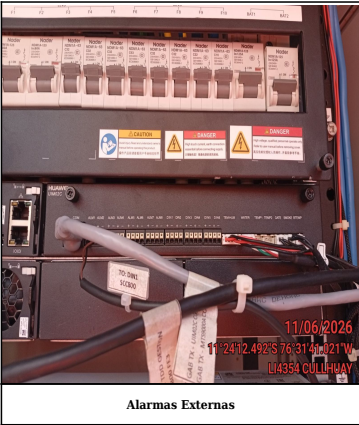

Alarmas Externas

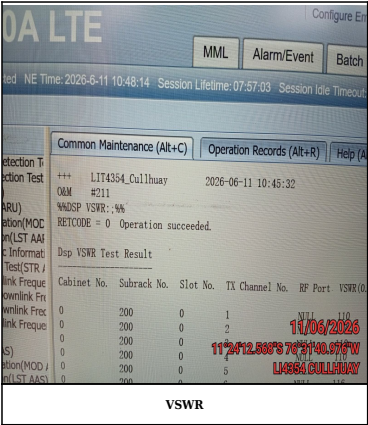

VSWR

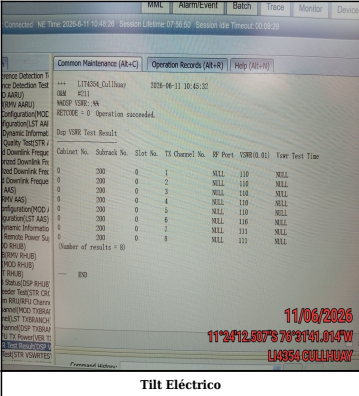

Tilt Eléctrico

VI.- SISTEMA RADIANTE:

Antenas:

Sectoriales TDD:	Estado:	OK
	Cantidad:	1
	Modelo:	ADT4516R8
	Tilt m.1(°):	OK

Microondas:	Estado:	OK
	Cantidad:	1



Torre



Vulcanizado Conectores S1

RRU	Cantidad:	1
	Conectores:	OK
	Cables RF/IF:	OK

Luz de Balizaje:	Estado:	N/A
	Cantidad:	0

Pararrayos:	Estado:	N/A
-------------	---------	-----



Vulcanizado Conectores S2



Vulcanizado Conectores S3

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado:	OK
Tipo:	PARRES
Cantidad:	2
Resistencia (Ω):	4.38
Topología :	MALLA



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

Baja autonomía debido a CE en zona



Observacuo 1
