

ZONA	SANTA CRUZ DE FLORES	NOMBRE SITE:	SANTA CRUZ DE FLORES	CODIGO SITE:	LI4834	FECHA :	2026-06-11 18:08:09
CRQ	CRQ000000081366	COORDENADAS	-12.615895 -76.641074	TÉCNICO RESPONSABLE	Jesus Casas		

I .- INFRAESTRUCTURA

Site:	Modelo:	Greenfield		
	Tipo:	Outdoor		
Torre:	Tipo:	autosoportada triangular		
	Estado:	OK		
	Altura (m):	30		
	Verticalidad:	OK		
	Pintura:	OK		
	Escalera:	OK		
	Línea de vida:	OK		
	Cable Vientos:	N/A		
	Grapas:	N/A		
	Templadores:	N/A		
	Base Templadores:	N/A		
	Base de Torre:	OK		
Paredes:	OK			
Concertina:	OK			
Puerta:	OK			
Chapa:	OK			

II .- SUMINISTRO DE ENERGIA AC:

Tipo de Instalacion:	Aérea	
Nivel de Tensión:	LBT	
Sistema de Conexión:	Monofásica	
N° Suministro:	6735733	
PDP:	Estado:	OK
	Voltaje 1(VAC):	225
	ITM(A):	50
	TVSS	OK
	Corriente 1(AAC):	9



13/01/2025
LJ4884

PDP

III .- SUMINISTRO DE ENERGIA DC:

Gabinete Rectificador:	Estado:	OK		
	Marca:	HUAWEI		
	Ventiladores:	OK		
	A/A:	OK		
	Filtros:	OK		
Power Core:	Marca:	Huawei		
	Modelo:	Huawei		
	Controlador:	Modelo:	SMU2b	
		Voltaje (VDC):	51	
		Carga (ADC):	24	
		LVBD/BLVD(VDC):	44	
		LVLD/LLVD(VDC):	47	
	Módulos:	Estado:	OK	
		Modelo1:	R4850G	
		Cantidad1:	2	
Bancada Total 1:	Estado:	OK		
	Cantidad:	0		
	Voltaje (V):	50		
	Marca1:	huawei		
	Modelo1:	ESM-48150A1		
	Capacidad1(Ah):	150		
	Autonomía (Hr):	30		

IV .- GABINETE DE TRANSMISION:

Gabinete Tx1:

Estado:

Ventiladores:

A/A:

Filtros:

Radios (#):

Routers (#):

Modem (#):

BBU (#):

Switch (#):

Media Converter (#):

OK

OK

OK

1

1

0


1

0

0



Gabinete Tx 1 Abierto



Pasamuro Gabinete Tx 1

V.- BTS:

BBU:

Tipo:

Estado:

FAN:

Cable FO:

TDD

OK

OK

Estado:

Banda 1 (MHz):

Cantidad:

VSWR:

Alarmas Externas:

Alarmas Internas:

OK

3500

1


OK

OK

OK




Panoramica de BBU1

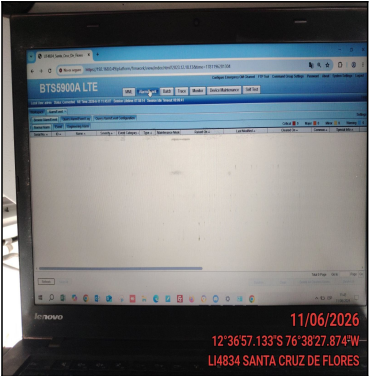


Alarmas Internas BBU1



Alarmas Externas

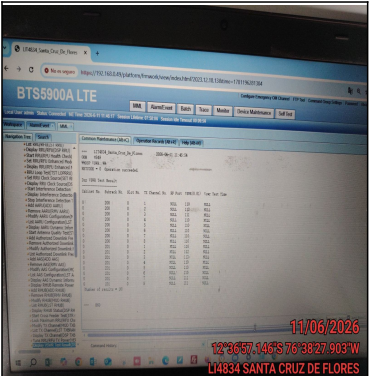

VSWR

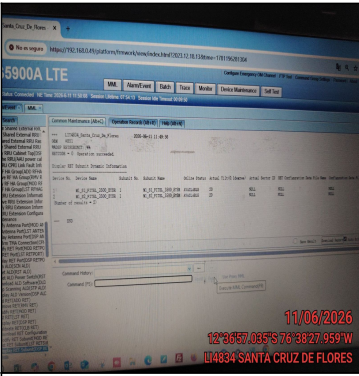

Tilt Eléctrico

VI.- SISTEMA RADIANTE:


Antenas:

Sectoriales TDD:	Estado:	OK
	Cantidad:	1
	Modelo:	ATD4516R8
	Tilt m.1(°):	OK

Microondas:	Estado:	OK
	Cantidad:	2



Torre

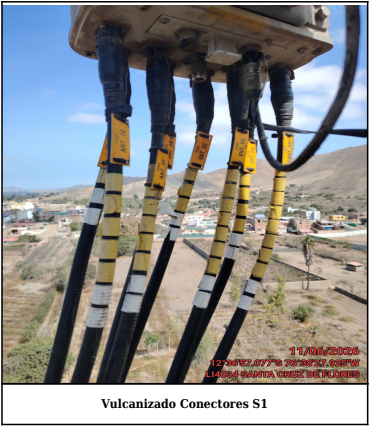

Vulcanizado Conectores S1


RRU	Cantidad:	6
	Conectores:	OK
	Cables RF/IF:	OK

Luz de Balizaje:	Estado:	OK
	Cantidad:	1

Pararrayos:	Estado:	OK
-------------	---------	----



Vulcanizado Conectores S2



Vulcanizado Conectores S3

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado:	OK
Tipo:	único
Cantidad:	3
Resistencia (Ω):	2.5
Topología :	único



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

NA

N/A

Observacion 1
