

I .- INFRAESTRUCTURA

Site:	Modelo:	Greenfield
	Tipo:	Outdoor
Torre:	Tipo:	Autosoportada Triangular
	Estado:	OK
	Altura (m):	30
	Verticalidad:	OK
	Pintura:	OK
	Escalera:	OK
	Línea de vida:	OK
	Cable Vientos:	N/A
	Grapas:	N/A
	Templadores:	N/A
	Base Templadores:	N/A
	Base de Torre:	OK
Paredes:	OK	
Concertina:	OK	
Puerta:	OK	
Chapa:	OK	



VISTA PANORAMICA DEL SITE




VISTA PARED PARIMETRICA

II .- SUMINISTRO DE ENERGIA AC:

Tipo de Instalacion:	Aérea
Nivel de Tensión:	LBT
Sistema de Conexión:	Monofásica
N° Suministro:	NV

PDP:	Estado:	OK
	Voltaje 1(VAC):	216
	ITM(A):	50
	TVSS	OK
	Corriente 1(AAC):	23

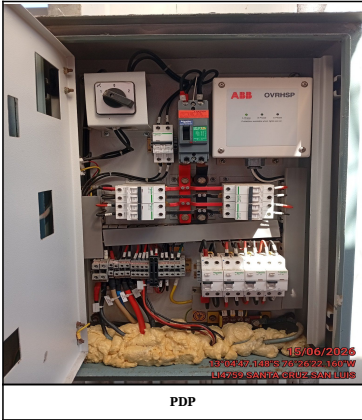

PDP

III .- SUMINISTRO DE ENERGIA DC:

Gabinete Rectificador:	Estado:	OK
	Marca:	Huawei
	Ventiladores:	OK
	A/A:	OK
	Filtros:	OK
Power Core:	Marca:	Huawei
	Modelo:	MTS9000A
	Controlador:	
	Modelo:	SMU02B
	Voltaje (VDC):	53
	Carga (ADC):	22
	LVBD/BLVD(VDC):	44
	LVLVD/LLVD(VDC):	47
	Módulos:	Estado: OK
	Modelo1:	R4850G
	Cantidad1:	2
Bancada Total 1:	Estado:	OK
	Cantidad:	3
	Voltaje (V):	53
	Marca1:	Huawei
	Modelo1:	ESM-48150A1
	Capacidad1(Ah):	150
	Autonomia (Hr):	22.2



Rectificador 1



Power Core 1

IV .- GABINETE DE TRANSMISION:

Gabinete Tx1:

Estado: OK

Ventiladores: OK

A/A: OK

Filtros: OK

Radios (#): 1

Routers (#): 1

Modem (#): 0


BBU (#): 1

Switch (#): 0

Media Converter (#): 0



Gabinete Tx 1 Abierto

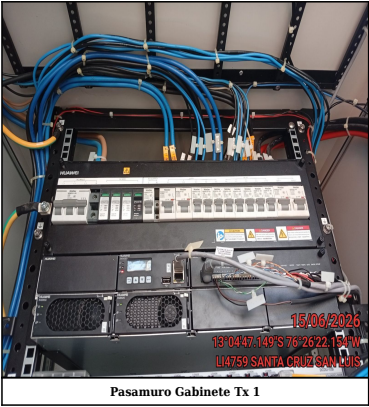

Pasamuro Gabinete Tx 1

V .- BTS:

BBU:

Tipo: BBU5900

Estado: OK

FAN: OK

Cable FO: Estado: OK

Banda 1 (MHz): 3500

Cantidad: 2


VSWR: OK

Alarmas Externas: OK

Alarmas Internas: OK




Panoramica de BBU1

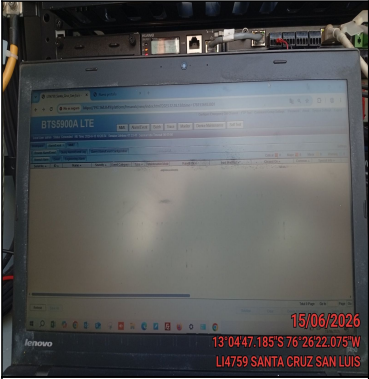


Alarmas Internas BBU1



Alarmas Externas

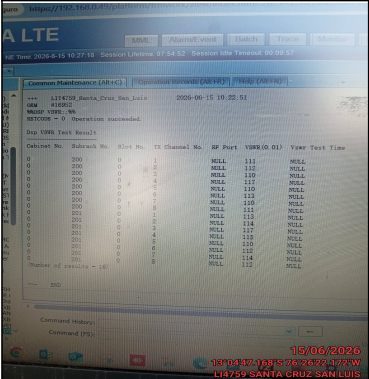

VSWR

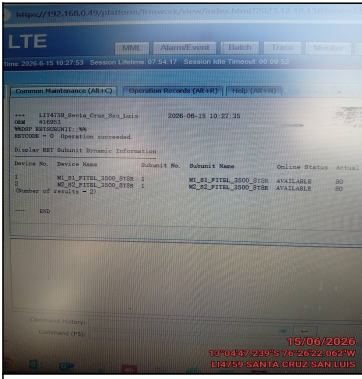


Tilt Eléctrico

VI .- SISTEMA RADIANTE:

Antenas:

Sectoriales TDD:	Estado:	OK
	Cantidad:	2
	Modelo:	NV
	Tilt m.1(°):	OK

Microondas:	Estado:	OK
	Cantidad:	1

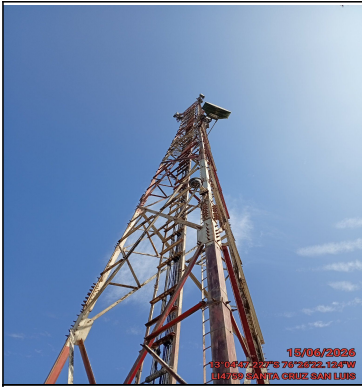

Torre



Vulcanizado Conectores S1

RRU	Cantidad:	2
	Conectores:	OK
	Cables RF/IF:	OK

Luz de Balizaje:	Estado:	N/A
	Cantidad:	0

Pararrayos:	Estado:	OK
-------------	---------	----



Vulcanizado Conectores S2



Vulcanizado Conectores S3

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado:	OK
Tipo:	Parres
Cantidad:	4
Resistencia (Ω)	2.12
Topologia :	Malla



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

NA

N/A

Observacion 1
