




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías

Nombre de la Estación: PALPA
Nombre de Localidad: AUCALLAMA
Fecha: 29/06/2026 - 29/06/2026
Dirección: CP PALPA
ID site: LI5098
CRQ: CRQ000000089832

Sticker Año mantenimiento



Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

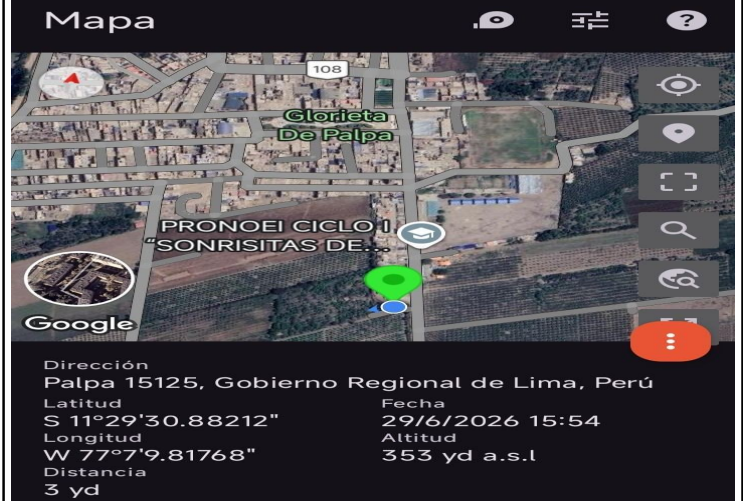

VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)


ANTES



DURANTE



DESPUES

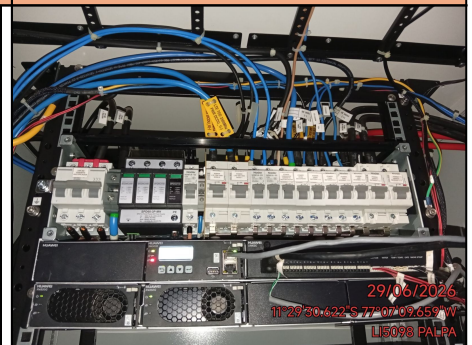

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



DURANTE




DESPUES




PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS


ANTES

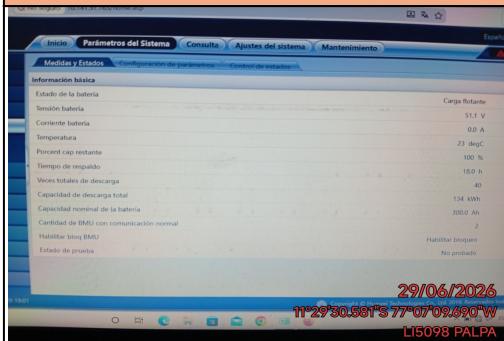

DURANTE

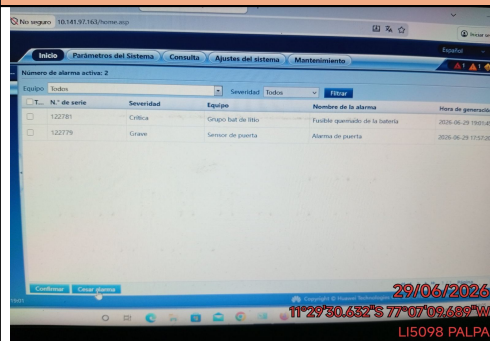

DESPUES

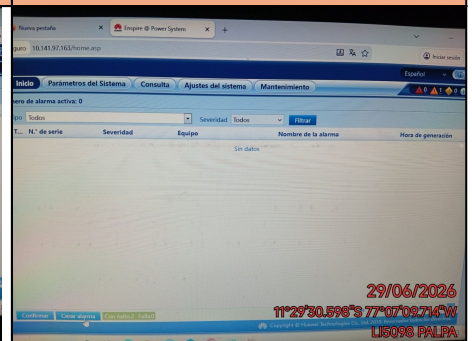

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos
