

ZONA	HUAROCHIRI	NOMBRE SITE:	HUAROCHIRI FITEL	CODIGO SITE:	LI5179	FECHA :	2026-06-30 15:28:15
CRQ	CRQ000000092060	COORDENADAS	12°8'9.912"S76°13'52.825"W	TÉCNICO RESPONSABLE	Jesus Casas		

I .- INFRAESTRUCTURA

Site:	Modelo:	Greenfield		
	Tipo:	Indoor		
Torre:	Tipo:	Autosportada triangular		
	Estado:	OK		
	Altura (m):	25		
	Verticalidad:	OK		
	Pintura:	OK		
	Escalera:	OK		
	Línea de vida:	OK		
	Cable Vientos:	N/A		
	Grapas:	N/A		
	Templadores:	N/A		
	Base Templadores:	N/A		
	Base de Torre:	OK		
Paredes:	OK			
Concertina:	OK			
Puerta:	OK			
Chapa:	OK			

II .- SUMINISTRO DE ENERGIA AC:

Tipo de Instalacion:	Súbterranea	
Nivel de Tensión:	LBT	
Sistema de Conexión:	Monofásica	
N° Suministro:	10019905627	
PDP:	Estado:	OK
	Voltaje 1(VAC):	215
	ITM(A):	50
	TVSS	OK
	Corriente 1(AAC):	15


III .- SUMINISTRO DE ENERGIA DC:

Gabinete Rectificador:	Estado:	OK		
	Marca:	Huawei		
	Ventiladores:	OK		
	A/A:	OK		
	Filtros:	OK		
Power Core:	Marca:	Huawei		
	Modelo:	MTS9000A		
	Controlador:			
	Modelo:	SMU02B		
	Voltaje (VDC):	51		
	Carga (ADC):	27		
	LVBD/BLVD(VDC):	43		
	LVLVD/LLVD(VDC):	47		
	Módulos:	Estado:	OK	
		Modelo1:	R4850G	
		Cantidad1:	3	
Bancada Total 1:	Estado:	OK		
	Cantidad:	5		
	Voltaje (V):	51		
	Marca1:	Huawei		
	Modelo1:	ESM-48150A1		
	Capacidad1(Ah):	150		
	Autonomia (Hr):	27.4		

IV .- GABINETE DE TRANSMISION:

Gabinete Tx1:

Estado:	OK
Ventiladores:	OK
A/A:	OK
Filtros:	OK
Radios (#):	1
Routers (#):	1
Modem (#):	0
BBU (#):	1
Switch (#):	0
Media Converter (#):	0

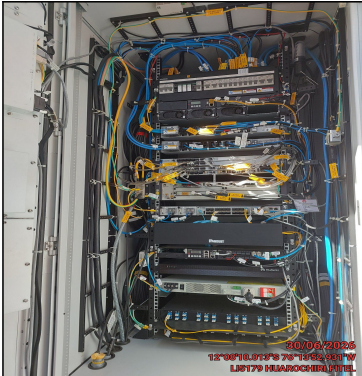

Gabinete Tx 1 Abierto



Pasamuro Gabinete Tx 1


V.- BTS:

BBU:


Tipo:	TDD
Estado:	OK
FAN:	OK
Cable FO:	Estado: OK
	Banda 1 (MHz): 3500
	Cantidad: 3
	VSWR: OK
	Alarmas Externas: OK
	Alarmas Internas: OK




Panoramica de BBU1




Alarmas Internas BBU1

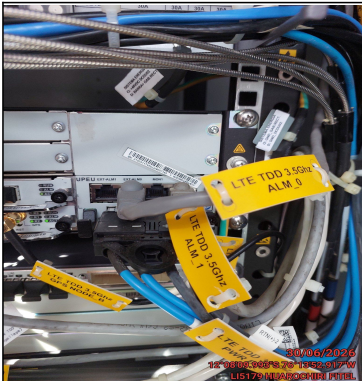

Alarmas Externas

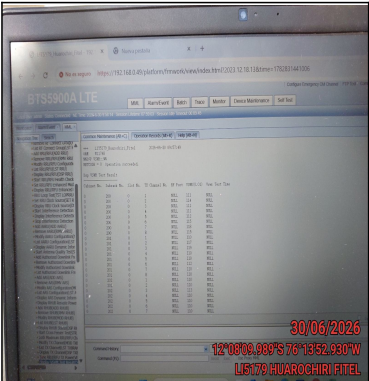

VSWR

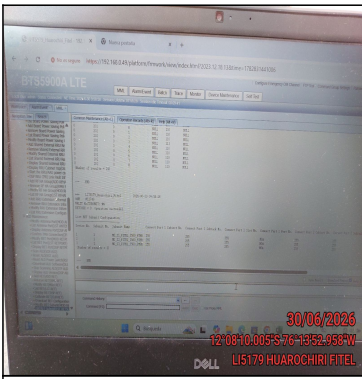

Tilt Eléctrico

VI.- SISTEMA RADIANTE:

Antenas:

Sectoriales TDD:	Estado:	OK
	Cantidad:	3
	Modelo:	Nv
	Tilt m.1(°):	OK

Microondas:	Estado:	OK
	Cantidad:	1

RRU	Cantidad:	3
	Conectores:	OK
	Cables RF/IF:	OK

Luz de Balizaje:	Estado:	N/A
	Cantidad:	0

Pararrayos:	Estado:	OK
-------------	---------	----



Torre



Vulcanizado Conectores S1



Vulcanizado Conectores S2



Vulcanizado Conectores S3

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado:	OK
Tipo:	Parres
Cantidad:	4
Resistencia (Ω)	3.38
Topologia :	Malla



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

site no cuenta con luz de valizaje



Observacion 1
