




Sticker Año mantenimiento


Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

DESPUES

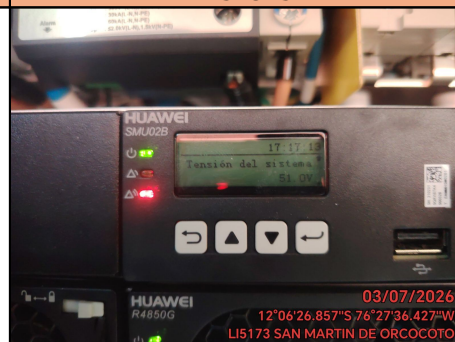

DESPUES

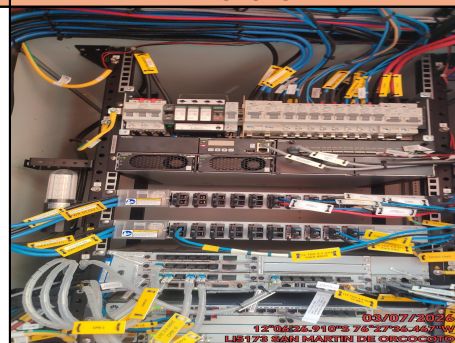

PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS

DESPUES

N/A

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos
