

I.- INFRAESTRUCTURA

Site:

Modelo: Greenfile

Tipo: Indoor

Torre:

Tipo: Triángular autosoportada

Estado: OK

Altura (m): 25

Verticalidad: OK

Pintura: OK

Escalera: OK

Línea de vida: OK

Cable Vientos: N/A

Grapas: N/A

Templadores: N/A

Base Templadores: N/A

Base de Torre: OK

Paredes: OK

Concertina: OK


Puerta: OK

Chapa: OK



03/07/2026
12°06'22.734"S 76°27'34.199"W
LI5173 SAN MARTIN DE ORCOCOTO

VISTA PANORAMICA DEL SITE

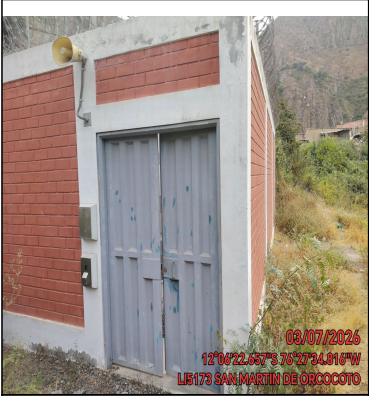

03/07/2026
12°06'22.657"S 76°27'34.016"W
LI5173 SAN MARTIN DE ORCOCOTO

VISTA PARED PARIMETRICA

II.- SUMINISTRO DE ENERGIA AC:

Tipo de Instalacion: Aérea

Nivel de Tensión: LBT

Sistema de Conexión: Monofásica

N° Suministro: No visible

PDP:


Estado: OK

Voltaje 1(VAC): 218

ITM(A): 50

TVSS OK

Corriente 1(AAC): 9.2

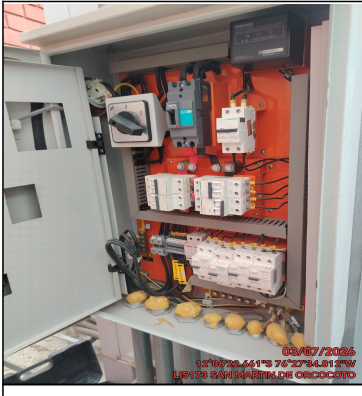

03/07/2026
12°06'22.641"S 76°27'34.812"W
LI5173 SAN MARTIN DE ORCOCOTO

PDP

III.- SUMINISTRO DE ENERGIA DC:

Gabinete Rectificador: Estado: OK

Marca: Huawei

Ventiladores: OK

A/A: OK

Filtros: OK

Power Core:

Marca: Huawei

Modelo: MTS9000A

Controlador:

Modelo: Huawei

Voltaje (VDC): 51

Carga (ADC): 15

LVBD/BLVD(VDC):43

LVLVD/LLVD(VDC): 47

Módulos:

Estado: OK

Modelo1: Huawei

Cantidad1: 2

Bancada Total 1:

Estado: OK

Cantidad: 2

Voltaje (V): 48

Marca1: Huawei

Modelo1: ESM-48150A1

Capacidad1(Ah): 20

Autonomía (Hr): 19.3



03/07/2026
12°06'22.746"S 76°27'34.848"W
LI5173 SAN MARTIN DE ORCOCOTO

Rectificador 1




03/07/2026
12°06'22.785"S 76°27'34.878"W
LI5173 SAN MARTIN DE ORCOCOTO

Power Core 1

IV.- GABINETE DE TRANSMISION:

Gabinete Tx1:



Estado:	OK
Ventiladores:	OK
A/A:	OK
Filtros:	OK
Radios (#):	1
Routers (#):	0
Modem (#):	0
BBU (#):	1
Switch (#):	0
Media Converter (#):	0

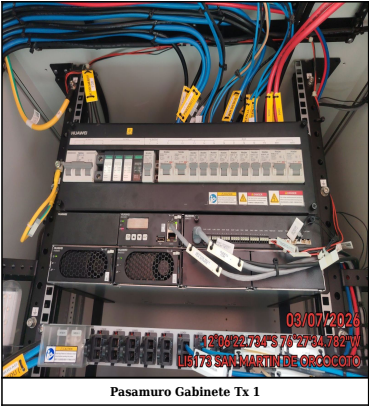

V .- BTS:

BBU:

Tipo:	5900
Estado:	OK
FAN:	OK
Cable FO:	Estado: OK
	Banda 1 (MHz): 3500
	Cantidad: 1
VSWR: OK	
Alarmas Externas: OK	
Alarmas Internas: OK	



VI .- SISTEMA RADIANTE:

Antenas:

Sectoriales TDD:	Estado:	OK
	Cantidad:	1
	Modelo:	N o visible
	Tilt m.1(°):	OK

Microondas:	Estado:	OK
	Cantidad:	1



Torre



Vulcanizado Conectores S1

RRU	Cantidad:	1
	Conectores:	OK
	Cables RF/IF:	OK

Luz de Balizaje:	Estado:	N/A
	Cantidad:	0

Pararrayos:	Estado:	OK
-------------	---------	----



Vulcanizado Conectores S2



Vulcanizado Conectores S3

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado:	OK
Tipo:	Parre
Cantidad:	5
Resistencia (Ω)	1.15
Topologia :	Malla



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra


VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT

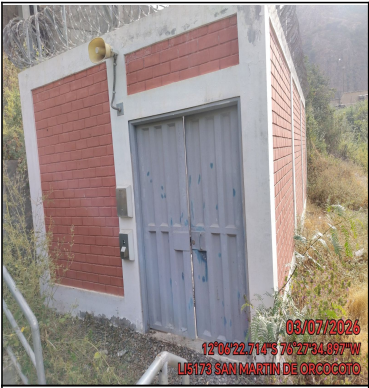

Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

Ok

N/A

Observacion 1
