

ZONA	HUARAL	NOMBRE SITE:	ESPERANZA BAJA	CODIGO SITE:	LI4942	FECHA :	2026-07-09 21:50:24
CRQ	CRQ000000095455	COORDENADAS	-11.455361,-77.247361	TÉCNICO RESPONSABLE	Paolo Arias		

I.- INFRAESTRUCTURA

Site:	Modelo:	GREENFIELD
	Tipo:	GABINETE OUTDOOR
Torre:	Tipo:	AUTOSOPORTADA
	Estado:	OK
	Altura (m):	30
	Verticalidad:	OK
	Pintura:	OK
	Escalera:	OK
	Línea de vida:	OK
	Cable Vientos:	N/A
	Grapas:	N/A
	Templadores:	N/A
	Base Templadores:	N/A
Base de Torre:	OK	
Paredes:	OK	
Concertina:	OK	
Puerta:	OK	
Chapa:	OK	



VISTA PANORAMICA DEL SITE




VISTA PARED PARIMETRICA

II .- SUMINISTRO DE ENERGIA AC:

Tipo de Instalacion:	Aérea
Nivel de Tensión:	LBT
Sistema de Conexión:	Monofásica
N° Suministro:	NV

PDP:	Estado:	OK
	Voltaje 1(VAC):	0
	ITM(A):	50
	TVSS	OK
	Corriente 1(AAC):	0

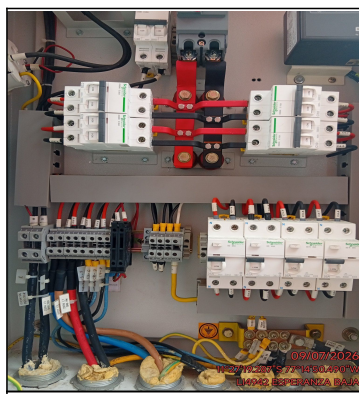

PDP

III .- SUMINISTRO DE ENERGIA DC:

Gabinete Rectificador:	Estado:	OK	
	Marca:	HUAWEI	
	Ventiladores:	OK	
	A/A:	OK	
	Filtros:	OK	
Power Core:	Marca:	HUAWEI	
	Modelo:	HUAWEI	
	Controlador:		
	Modelo:	SMU02B	
	Voltaje (VDC):	51	
	Carga (ADC):	20	
	LVBD/BLVD(VDC):	43	
	LVLD/LLVD(VDC):	46	
	Módulos:	Estado:	OK
		Modelo1:	R4850G
		Cantidad1:	2
Bancada Total 1:	Estado:	OK	
	Cantidad:	3	
	Voltaje (V):	51	
	Marca1:	OTROS	
	Modelo1:	ESM-48150A1	
	Capacidad1(Ah):	150	
	Autonomía (Hr):	6	



Rectificador 1



Power Core 1

IV .- GABINETE DE TRANSMISION:

Gabinete Tx1:

Estado:

Ventiladores:

A/A:

Filtros:

Radios (#):

Routers (#):

Modem (#):

BBU (#):

Switch (#):

Media Converter (#):

OK

OK

OK

OK

1


0

0

1

0

1

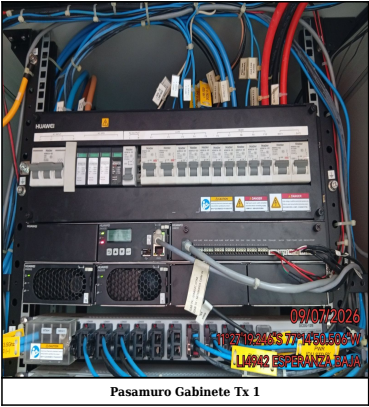

V .- BTS:

BBU:

Tipo:

Estado:

FAN:

Cable FO:

BBU5900

OK

OK

Estado:

Banda 1 (MHz):

Cantidad:

OK

0

0

VSWR:



Alarmas Externas:

Alarmas Internas:

OK

OK

OK

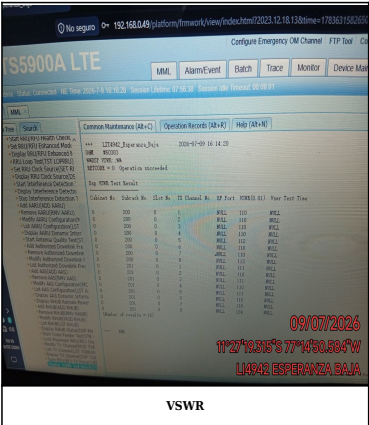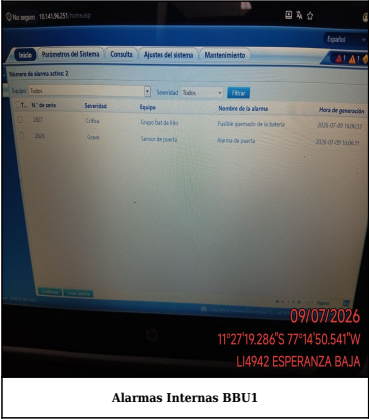

VI .- SISTEMA RADIANTE:


Antenas:

Sectoriales TDD:	Estado:	OK
	Cantidad:	4
	Modelo:	NV
	Tilt m.1(°):	OK

Microondas:	Estado:	OK
	Cantidad:	1



Torre



Vulcanizado Conectores S1


RRU	Cantidad:	5
	Conectores:	OK
	Cables RF/IF:	OK

Luz de Balizaje:	Estado:	OK
	Cantidad:	1

Pararrayos:	Estado:	OK
-------------	---------	----



Vulcanizado Conectores S2



Vulcanizado Conectores S3

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado:	OK
Tipo:	PARRES
Cantidad:	1
Resistencia (Ω)	3
Topologia :	MALLA



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

NA

N/A

Observacion 1
