

ZONA	CHANCAY	NOMBRE SITE:	QUEPE PAMPA	CODIGO SITE:	LI5112	FECHA :	2026-07-11 19:50:28
CRQ	CRQ000000095276	COORDENADAS	-11.526268,-77.250332	TÉCNICO RESPONSABLE	Paolo Arias		


I .- INFRAESTRUCTURA

Site:	Modelo:	GREENFIELD		
	Tipo:	GABINETE OUTDOOR		
Torre:	Tipo:	AUTOSOPORTADA		
	Estado:	OK		
	Altura (m):	30		
	Verticalidad:	OK		
	Pintura:	OK		
	Escalera:	OK		
	Línea de vida:	OK		
	Cable Vientos:	N/A		
	Grapas:	N/A		
	Templadores:	N/A		
	Base Templadores:	N/A		
	Base de Torre:	OK		
Paredes:	OK			
Concertina:	OK			
Puerta:	OK			
Chapa:	OK			

VISTA PANORAMICA DEL SITE


VISTA PARED PARIMETRICA

II .- SUMINISTRO DE ENERGIA AC:

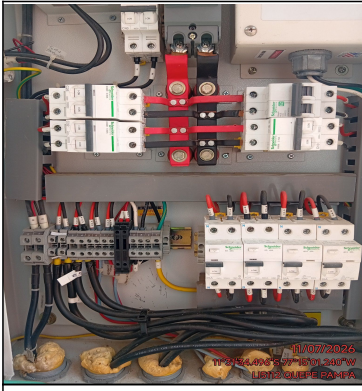Tipo de Instalacion:	Aérea			
Nivel de Tensión:	LBT			
Sistema de Conexión:	Monofásica			
N° Suministro:	NV			
PDP:	Estado:	OK		
	Voltaje 1(VAC):	0		
	ITM(A):	50		
	TVSS	OK		
	Corriente 1(AAC):	0		

PDP

III .- SUMINISTRO DE ENERGIA DC:

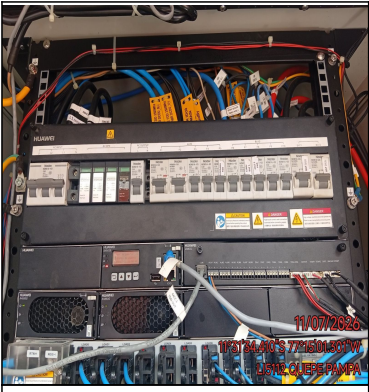Gabinete Rectificador:	Estado:	OK		
	Marca:	HUAWEI		
	Ventiladores:	OK		
	A/A:	OK		
	Filtros:	OK		
Power Core:	Marca:	HUAWEI		
	Modelo:	HUAWEI		
	Controlador:			
	Modelo:	SMU02B		
	Voltaje (VDC):	51		
	Carga (ADC):	20		
	LVBD/BLVD(VDC):	43		
	LVLVD/LLVD(VDC):	46		
	Módulos:	Estado:	OK	
		Modelo1:	R4850G	
		Cantidad1:	2	
Bancada Total 1:	Estado:	OK		
	Cantidad:	3		
	Voltaje (V):	51		
	Marca1:	OTROS		
	Modelo1:	ESM-48150A1		
	Capacidad1(Ah):	150		
	Autonomía (Hr):	6		

Rectificador 1

Power Core 1

IV .- GABINETE DE TRANSMISION:

Gabinete Tx1:

Estado:

Ventiladores:

A/A:

Filtros:

Radios (#):

Routers (#):

Modem (#):

BBU (#):

Switch (#):

Media Converter (#):

OK

OK

OK

OK

1


0

0

1

0

1

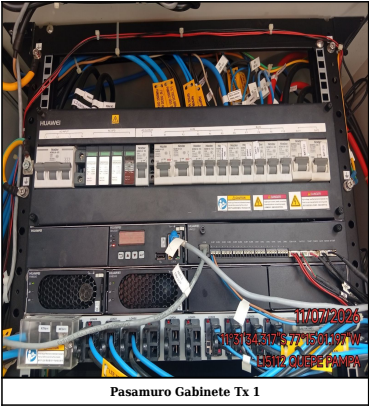

V .- BTS:

BBU:

Tipo:

Estado:

FAN:

Cable FO:

BBU5900

OK

OK

Estado:

Banda 1 (MHz):

Cantidad:

OK

0

0

VSWR:




Alarmas Externas:

Alarmas Internas:

OK

OK

OK

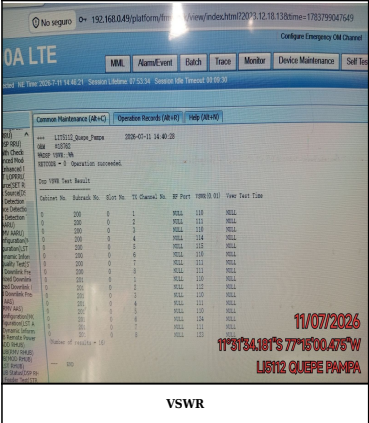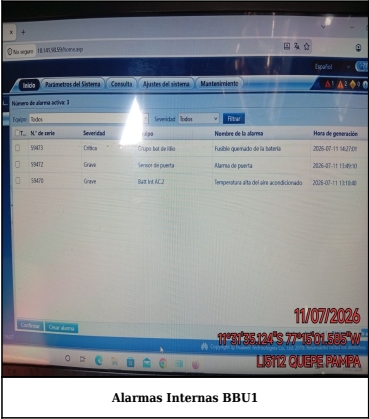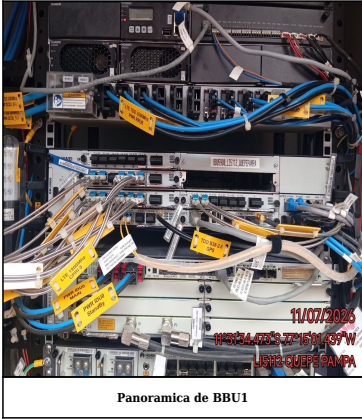

VI .- SISTEMA RADIANTE:

Antenas:

Sectoriales TDD: Estado: OK
Cantidad: 6
Modelo: NV
Tilt m.1(°): OK

Microondas: Estado: OK
Cantidad: 1



Torre



Vulcanizado Conectores S1

RRU Cantidad: 6
Conectores: OK
Cables RF/IF: OK

Luz de Balizaje: Estado: OK
Cantidad: 1

Pararrayos: Estado: OK



Vulcanizado Conectores S2



Vulcanizado Conectores S3

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado: OK
Tipo: PARRES
Cantidad: 4
Resistencia (Ω): 3
Topologia : MALLA



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra


VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT

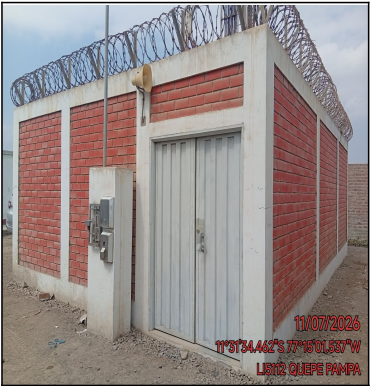

Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

NA

N/A

Observacion 1
