

ZONA	GORGOR	NOMBRE SITE:	RAJANYA	CODIGO SITE:	LI5659	FECHA :	2026-07-16 20:55:35
CRQ	CRQ000000098516	COORDENADAS	-10.603083,-77.097853	TÉCNICO RESPONSABLE	Boris Flores		

I.- INFRAESTRUCTURA

Site:	Modelo:	greenfield
	Tipo:	indoor
Torre:	Tipo:	autosoportada
	Estado:	Triangular
	Altura (m):	OK
	Verticalidad:	30
	Pintura:	OK
	Escalera:	OK
	Línea de vida:	OK
	Cable Vientos:	N/A
	Grapas:	N/A
	Templadores:	N/A
	Base Templadores:	N/A
	Base de Torre:	OK
Paredes:	OK	
Concertina:	OK	
Puerta:	OK	
Chapa:	OK	



VISTA PANORAMICA DEL SITE



VISTA PARED PARIMETRICA

II.- SUMINISTRO DE ENERGIA AC:

Tipo de Instalacion:	Súbterranea
Nivel de Tensión:	LBT
Sistema de Conexión:	Monofásica
N° Suministro:	nv

PDP:	Estado:	OK
	Voltaje 1(VAC):	220
	ITM(A):	50
	TVSS	OK
	Corriente 1(AAC):	14.8



PDP

III.- SUMINISTRO DE ENERGIA DC:

Gabinete Rectificador:	Estado:	OK
	Marca:	Huawei
	Ventiladores:	OK
	A/A:	OK
	Filtros:	OK
Power Core:	Marca:	Huawei
	Modelo:	mts9000a
	Controlador:	
	Modelo:	smu02b
	Voltaje (VDC):	51
	Carga (ADC):	17
	LVBD/BLVD(VDC):	43
	LVLVD/LLVD(VDC):	47
	Módulos:	
	Estado:	OK
	Modelo1:	r4850g
	Cantidad1:	2



Rectificador 1



Power Core 1

Bancada Total 1:	Estado:	OK
	Cantidad:	2
	Voltaje (V):	51
	Marca1:	Huawei
	Modelo1:	esm48150a
	Capacidad1(Ah):	150
	Autonomía (Hr):	19

IV.- GABINETE DE TRANSMISION:

Gabinete Tx1:

Estado:

Ventiladores:

A/A:

Filtros:

Radios (#):

Routers (#):

Modem (#):

BBU (#):

Switch (#):

Media Converter (#):

OK

OK

OK

OK

1


0

0


1

0

0

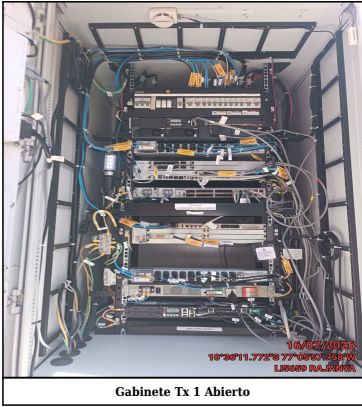

Gabinete Tx 1 Abierto

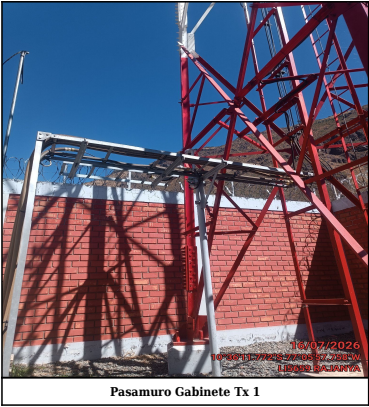

Pasamuro Gabinete Tx 1

V .- BTS:

BBU:

Tipo:

Estado:

FAN:

Cable FO:

tdd

OK

OK

Estado:

Banda 1 (MHz):

Cantidad:

OK

3500

1

VSWR:

Alarmas Externas:

Alarmas Internas:


OK

OK

OK




Panoramica de BBU1

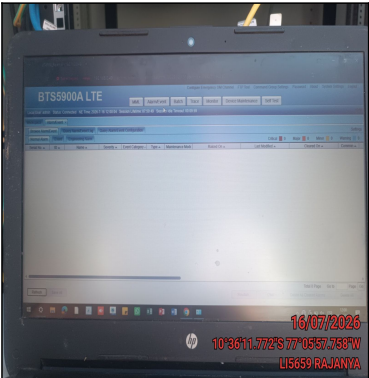


Alarmas Internas BBU1



Alarmas Externas

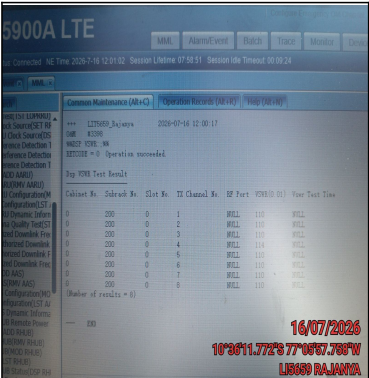

VSWR

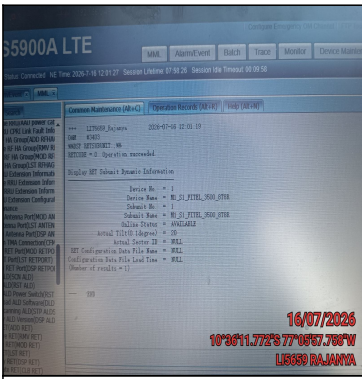

Tilt Eléctrico

VI .- SISTEMA RADIANTE:

Antenas:

Sectoriales TDD:	Estado:	OK
	Cantidad:	2
	Modelo:	nv
	Tilt m.1(°):	N/A

Microondas:	Estado:	OK
	Cantidad:	1



Torre



Vulcanizado Conectores S1

RRU	Cantidad:	1
	Conectores:	OK
	Cables RF/IF:	OK

Luz de Balizaje:	Estado:	OK
	Cantidad:	1

Pararrayos:	Estado:	OK
-------------	---------	----



Vulcanizado Conectores S2



Vulcanizado Conectores S3

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado:	OK
Tipo:	parres
Cantidad:	3
Resistencia (Ω):	1.37
Topologia :	mallá



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra


VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT

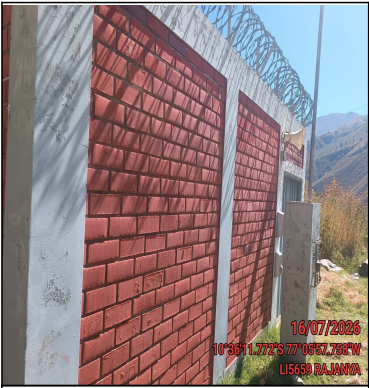

Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

realizar mantenimiento cada 3 meses

N/A

Observacion 1
