

ZONA	QUINCHES	NOMBRE SITE:	QUINCHES	CODIGO SITE:	LI5641	FECHA :	2026-07-17 18:08:20
CRQ	CRQ000000099028	COORDENADAS	12°	TÉCNICO RESPONSABLE	Alcides Guevara		

I .- INFRAESTRUCTURA

Site:	Modelo:	GREENFIELD		
	Tipo:	INDOOR		
Torre:	Tipo:	AUTOSOPORTA		
	Estado:	OK		
	Altura (m):	40		
	Verticalidad:	OK		
	Pintura:	OK		
	Escalera:	OK		
	Línea de vida:	OK		
	Cable Vientos:	N/A		
	Grapas:	N/A		
	Templadores:	N/A		
	Base Templadores:	N/A		
	Base de Torre:	OK		
Paredes:	OK			
Concertina:	OK			
Puerta:	OK			
Chapa:	OK			

VISTA PANORAMICA DEL SITE

VISTA PARED PARIMETRICA

II .- SUMINISTRO DE ENERGIA AC:

Tipo de Instalacion:	Aérea	
Nivel de Tensión:	LBT	
Sistema de Conexión:	Monofásica	
N° Suministro:	4842	
PDP:	Estado: OK	
	Voltaje 1(VAC): 217	
	ITM(A): 50	
	TVSS OK	
	Corriente 1(AAC): 6.5	

PDP

III .- SUMINISTRO DE ENERGIA DC:

Gabinete Rectificador:	Estado: OK		
	Marca: HUAWEI		
	Ventiladores: OK		
	A/A: OK		
	Filtros: OK		
Power Core:	Marca: HUAWEI		
	Modelo: ETP-48200A1		
	Controlador:		
	Modelo: SMU02B		
	Voltaje (VDC): 51		
	Carga (ADC): 29.6		
	LVBD/BLVD(VDC):41		
	LVLVD/LLVD(VDC): 46		
	Módulos:		
	Estado: OK		
	Modelo1: R4850G		
	Cantidad1: 3		
Bancada Total 1:	Estado: OK		
	Cantidad: 5		
	Voltaje (V): 51		
	Marca1: Huawei		
	Modelo1: ESM-48150A1		
	Capacidad1(Ah): 150		
	Autonomia (Hr): 38		

Rectificador 1

Power Core 1

IV .- GABINETE DE TRANSMISION:

Gabinete Tx1:

Estado:	OK
Ventiladores:	OK
A/A:	OK
Filtros:	OK
Radios (#):	1
Routers (#):	1
Modem (#):	0
BBU (#):	1
Switch (#):	0
Media Converter (#):	0



Gabinete Tx 1 Abierto



Pasamuro Gabinete Tx 1


V .- BTS:

BBU:

Tipo:	BBU5900
Estado:	OK
FAN:	OK
Cable FO:	Estado: OK
	Banda 1 (MHz): 3500
	Cantidad: 2
	VSWR: OK
	Alarmas Externas: OK
	Alarmas Internas: OK




Panoramica de BBU1

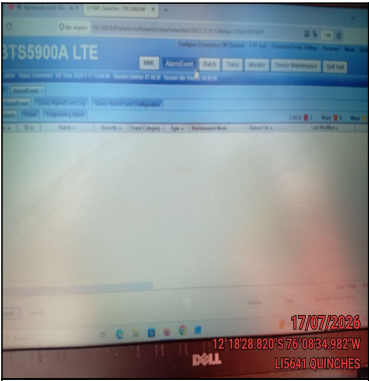


Alarmas Internas BBU1



Alarmas Externas

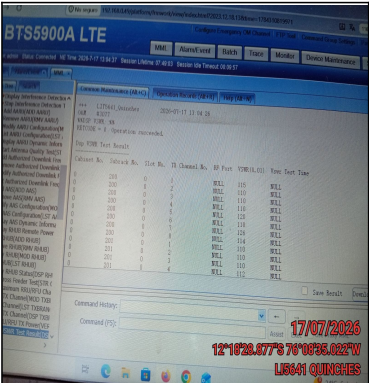

VSWR

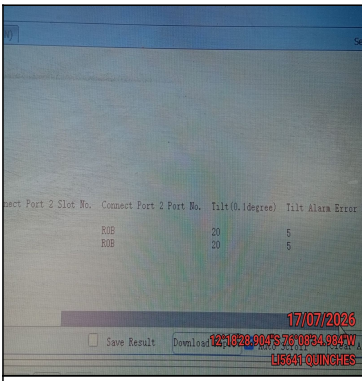

Tilt Eléctrico

VI .- SISTEMA RADIANTE:

Antenas:

Sectoriales TDD:	Estado:	OK
	Cantidad:	2
	Modelo:	ATD
	Tilt m.1(°):	OK

Microondas:	Estado:	OK
	Cantidad:	1

RRU	Cantidad:	2
	Conectores:	OK
	Cables RF/IF:	OK

Luz de Balizaje:	Estado:	N/A
	Cantidad:	0

Pararrayos:	Estado:	OK
-------------	---------	----



Torre



Vulcanizado Conectores S1



Vulcanizado Conectores S2



Vulcanizado Conectores S3

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado:	OK
Tipo:	mallas
Cantidad:	4
Resistencia (Ω)	2.67
Topología :	horizontal



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

NA

N/A

Observacion 1
