

ZONA	HUARAL	NOMBRE SITE:	CENTENARIO HUACHO CHICO	CODIGO SITE:	LI4844	FECHA :	2026-07-18 21:32:08
CRQ	CRQ000000098514	COORDENADAS	-11.425028,-77.265139	TÉCNICO RESPONSABLE	Paolo Arias		

I .- INFRAESTRUCTURA

Site:	Modelo:	GREENFIELD
	Tipo:	GABINETES OUTDOOR
Torre:	Tipo:	AUTOSOPORTADA
	Estado:	OK
	Altura (m):	25
	Verticalidad:	OK
	Pintura:	OK
	Escalera:	OK
	Línea de vida:	OK
	Cable Vientos:	N/A
	Grapas:	N/A
	Templadores:	N/A
	Base Templadores:	N/A
	Base de Torre:	OK
Paredes:	OK	
Concertina:	OK	
Puerta:	OK	
Chapa:	OK	



VISTA PANORAMICA DEL SITE




VISTA PARED PARIMETRICA

II .- SUMINISTRO DE ENERGIA AC:

Tipo de Instalacion:	Aérea
Nivel de Tensión:	LBT
Sistema de Conexión:	Monofásica
N° Suministro:	NV

PDP:	Estado:	OK
	Voltaje 1(VAC):	0
	ITM(A):	50
	TVSS	OK
	Corriente 1(AAC):	0

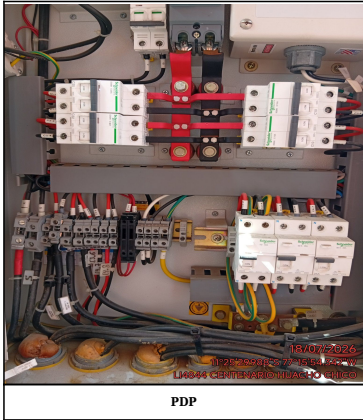


PDP

III .- SUMINISTRO DE ENERGIA DC:

Gabinete Rectificador:	Estado:	OK
	Marca:	HUAWEI
	Ventiladores:	OK
	A/A:	OK
	Filtros:	OK
Power Core:	Marca:	HUAWEI
	Modelo:	HUAWEI
	Controlador:	
	Modelo:	SMU02B
	Voltaje (VDC):	51
	Carga (ADC):	29
	LVBD/BLVD(VDC):	43
	LVLVD/LLVD(VDC):	46
	Módulos:	Estado: OK
		Modelo1: R4850G
		Cantidad1: 3
Bancada Total 1:	Estado:	OK
	Cantidad:	4
	Voltaje (V):	51
	Marca1:	HUAWEI
	Modelo1:	ESM-48150A1
	Capacidad1(Ah):	150
	Autonomía (Hr):	24



Rectificador 1

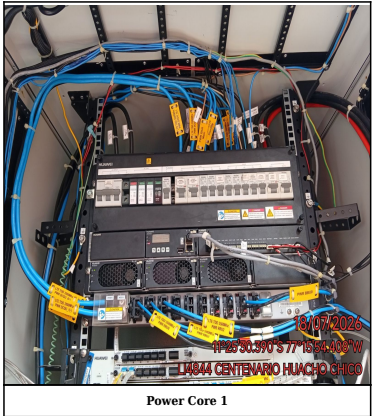

Power Core 1

IV .- GABINETE DE TRANSMISION:

Gabinete Tx1:

Estado:

Ventiladores:

A/A:

Filtros:

Radios (#):

Routers (#):

Modem (#):

BBU (#):

Switch (#):

Media Converter (#):

OK

OK

OK

OK

1

0

0

1

1

1



Gabinete Tx 1 Abierto



Pasamuro Gabinete Tx 1

V .- BTS:

BBU:

Tipo:

Estado:

FAN:

Cable FO:

BBU5900

OK

OK

Estado:

Banda 1 (MHz):

Cantidad:

VSWR:

Alarmas Externas:

Alarmas Internas:

OK

0

0


OK

OK

OK




Panoramica de BBU1

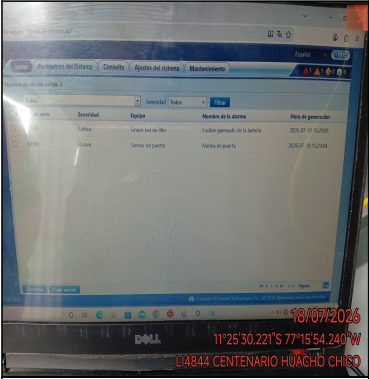

Alarmas Internas BBU1



Alarmas Externas



VSWR



Tilt Eléctrico

VI .- SISTEMA RADIANTE:

Antenas:

Sectoriales TDD:	Estado:	OK
	Cantidad:	7
	Modelo:	NV
	Tilt m.1(°):	OK

Microondas:	Estado:	OK
	Cantidad:	1



Torre



Vulcanizado Conectores S1

RRU	Cantidad:	7
	Conectores:	OK
	Cables RF/IF:	OK

Luz de Balizaje:	Estado:	OK
	Cantidad:	0

Pararrayos:	Estado:	OK
-------------	---------	----



Vulcanizado Conectores S2



Vulcanizado Conectores S3

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado:	OK
Tipo:	PARRES
Cantidad:	9
Resistencia (Ω)	3
Topologia :	MALLA



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

NA

N/A

Observacion 1
