




REPORTE FOTOGRÁFICO - UPS

Nombre de la Estacion: SEGUNDO POLO
Nombre de Localidad: SAN JUAN DE MIRAFLORES
Fecha: 21/07/2026 - 21/07/2026
Direccion: JR AYABACA 135-137
ID site: LI0719
CRQ: CRQ000000103020

Sticker Año mantenimiento



Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

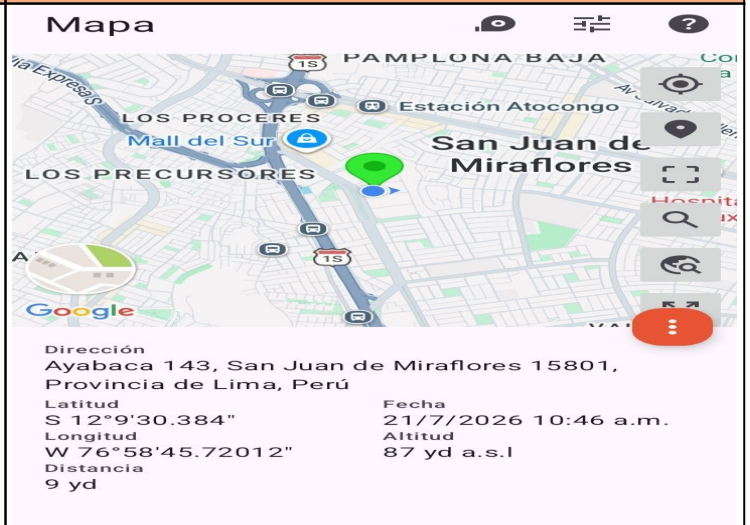

VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: VOLTAJE[V]


ANTES



DURANTE



DESPUES

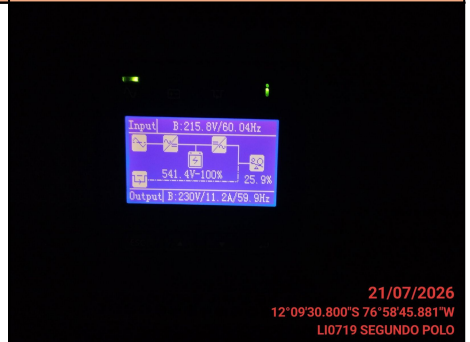

LIMPIEZA TECNICA DE COMPONENTES

ANTES



DURANTE



DESPUES



AJUSTE DE CONEXIONADO EN UPS

ANTES



DURANTE



DESPUES



PRUEBAS DE ALARMAS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 21/07/2026 12°09'30.748"S 76°58'45.856"W LI0719 SEGUNDO POLO	 21/07/2026 12°09'30.751"S 76°58'45.880"W LI0719 SEGUNDO POLO	 21/07/2026 12°09'30.578"S 76°58'45.958"W LI0719 SEGUNDO POLO

CHECKLIST - UPS		
UPS	Realizado	
Voltaje	OK	Verificación de parámetros de operación (Voltaje, amperaje y temperatura)
Control	OK	Verificación de control de UPS (tarjeta de fuente de alimentación, sensores)
Gestion	OK	Revisión de configuración de alarmas
Gestion	OK	Verificación de cable de gestión y puerto de comunicación
Ajustes	OK	Revisión interna y externa de la unidad, ajuste de todos los elementos mecánicos (pernos, tuercas, etc.
Pruebas	OK	Prueba de corte de energía comercial (prueba de descarga de baterías)
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Aterramiento	OK	Verificar los puntos de aterramientos
Limpieza	OK	Limpieza general
