

ZONA	SANTA ROSA DE QUIVES	NOMBRE SITE:	HUANCHIPUQUIO	CODIGO SITE:	LI4470	FECHA :	2026-07-21 17:58:04
CRQ	CRQ000000102971	COORDENADAS	114239.122°S 765633. 234°W	TÉCNICO RESPONSABLE	Jhoander Maxdebil		

I .- INFRAESTRUCTURA

Site:	Modelo:	Greenfield		
	Tipo:	Indoor		
Torre:	Tipo:	Triángular autosoportada		
	Estado:	OK		
	Altura (m):	25		
	Verticalidad:	OK		
	Pintura:	OK		
	Escalera:	OK		
	Línea de vida:	OK		
	Cable Vientos:	N/A		
	Grapas:	N/A		
	Templadores:	N/A		
Paredes:	Base Templadores:	N/A		
	Base de Torre:	OK		
Concertina:		OK		
Puerta:		OK		
Chapa:		OK		

II .- SUMINISTRO DE ENERGIA AC:

Tipo de Instalacion:	Aérea	
Nivel de Tensión:	LBT	
Sistema de Conexión:	Monofásica	
N° Suministro:	No visible	
PDP:	Estado:	OK
	Voltaje 1(VAC):	223
	ITM(A):	50
	TVSS	OK
	Corriente 1(AAC):	13.2



21/07/2025
18°33'57.64"S 74°59'55.218"W
100479 HLAHC01706500

PDP

III .- SUMINISTRO DE ENERGIA DC:

Gabinete Rectificador:	Estado:	OK			
	Marca:	Huawei			
	Ventiladores:	OK			
	A/A:	OK			
	Filtros:	OK			
Power Core:	Marca:	Huawei			
	Modelo:	MTS9000A			
	Controlador:				
	Modelo:	SMU02B			
	Voltaje (VDC):	51			
	Carga (ADC):	15.4			
	LVBD/BLVD(VDC):	43			
	LVLDD/LLVD(VDC):	47			
	Módulos:	Estado:			OK
		Modelo1:			R4050G
	Cantidad1:	2			
Bancada Total 1:	Estado:	OK			
	Cantidad:	2			
	Voltaje (V):	48.2			
	Marca1:	Huawei			
	Modelo1:	ESM-48150A1			
	Capacidad1(Ah):	150			
	Autonomía (Hr):	19.5			

IV .- GABINETE DE TRANSMISION:

Gabinete Tx1: Estado: OK
Ventiladores: OK
A/A: OK
Filtros: OK
Radios (#): 1
Routers (#): 0
Modem (#): 0
BBU (#): 1
Switch (#): 0
Media Converter (#): 0



Gabinete Tx 1 Abierto



Pasamuro Gabinete Tx 1


V .- BTS:

BBU: Tipo: 5900
Estado: OK
FAN: OK
Cable FO: Estado: OK
Banda 1 (MHz): 3500
Cantidad: 1

VSWR: OK
Alarmas Externas: OK
Alarmas Internas: OK




Panoramica de BBU1




Alarmas Internas BBU1



Alarmas Externas

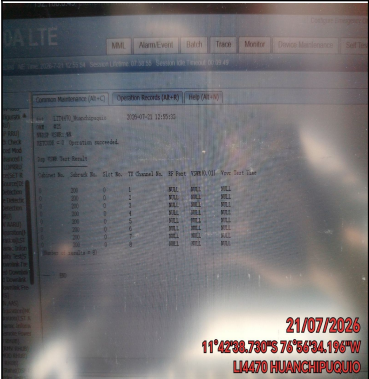

VSWR

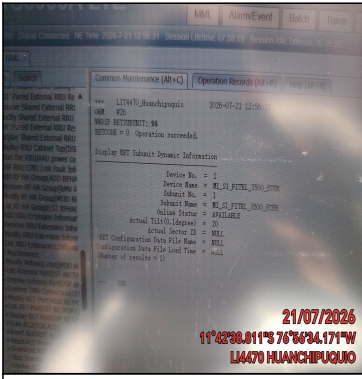

Tilt Eléctrico

VI .- SISTEMA RADIANTE:

Antenas:

Sectoriales TDD:	Estado:	OK
	Cantidad:	0
	Modelo:	No visible
	Tilt m.1(°):	OK

Microondas:	Estado:	OK
	Cantidad:	1



Torre



Vulcanizado Conectores S1

RRU	Cantidad:	1
	Conectores:	OK
	Cables RF/IF:	OK

Luz de Balizaje:	Estado:	N/A
	Cantidad:	0

Pararrayos:	Estado:	OK
-------------	---------	----



Vulcanizado Conectores S2



Vulcanizado Conectores S3

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado:	OK
Tipo:	Parres
Cantidad:	3
Resistencia (Ω)	1.33
Topologia :	Malla



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

Ok

N/A

Observacion 1
