

ZONA	HUAMPARA	NOMBRE SITE:	HUAMPARA	CODIGO SITE:	LI5624	FECHA :	2026-07-22 17:20:10
CRQ	CRQ000000103025	COORDENADAS	12°21'40.70484"S 76°9'55.70244"W	TÉCNICO RESPONSABLE	Alcides Guevara		

I .- INFRAESTRUTURA

Site:	Modelo:	Greenfield
	Tipo:	AUTDOOR
Torre:	Tipo:	autosoportada
	Estado:	triangular
	Altura (m):	OK
	Verticalidad:	25
	Pintura:	OK
	Escalera:	OK
	Línea de vida:	OK
	Cable Vientos:	N/A
	Grapas:	N/A
	Templadores:	N/A
	Base Templadores:	N/A
	Base de Torre:	OK
Paredes:	OK	
Concertina:	OK	
Puerta:	OK	
Chapa:	OK	



VISTA PANORAMICA DEL SITE




VISTA PARED PARIMETRICA

II .- SUMINISTRO DE ENERGIA AC:

Tipo de Instalacion:	Aérea
Nivel de Tensión:	LBT
Sistema de Conexión:	Monofásica
N° Suministro:	68356968


PDP:	Estado:	OK
	Voltaje 1(VAC):	215
	ITM(A):	50
	TVSS	OK
	Corriente 1(AAC):	10

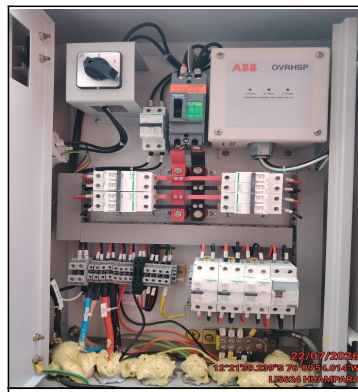

PDP

III .- SUMINISTRO DE ENERGIA DC:

Gabinete Rectificador:	Estado:	OK	
	Marca:	Huawei	
	Ventiladores:	OK	
	A/A:	OK	
	Filtros:	OK	
Power Core:	Marca:	Huawei	
	Modelo:	Huawei	
	Controlador:		
		Modelo:	SMU2B
		Voltaje (VDC):	51
		Carga (ADC):	22
		LVBD/BLVD(VDC):	44
		LVLVD/LLVD(VDC):	46
	Módulos:	Estado:	OK
		Modelo1:	R4850G
		Cantidad1:	2
Bancada Total 1:	Estado:	OK	
	Cantidad:	4	
	Voltaje (V):	51	
	Marca1:	Huawei	
	Modelo1:	ESM-48150A1	
	Capacidad1(Ah):	150	
	Autonomia (Hr):	30	

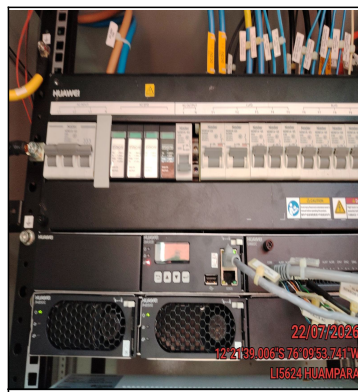

Rectificador 1



Power Core 1

IV .- GABINETE DE TRANSMISION:

Gabinete Tx1:

Estado:

Ventiladores:

A/A:

Filtros:

Radios (#):

Routers (#):

Modem (#):

BBU (#):

Switch (#):

Media Converter (#):

OK

OK

OK

OK

0


1

0

1

0

0



V.- BTS:

BBU:

Tipo:

Estado:

FAN:

Cable FO:

TDD

OK

OK

Estado:

Banda 1 (MHz):

Cantidad:

OK

3500

1

VSWR:




Alarmas Externas:

Alarmas Internas:

OK

OK

OK

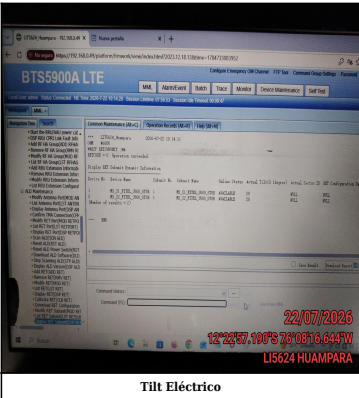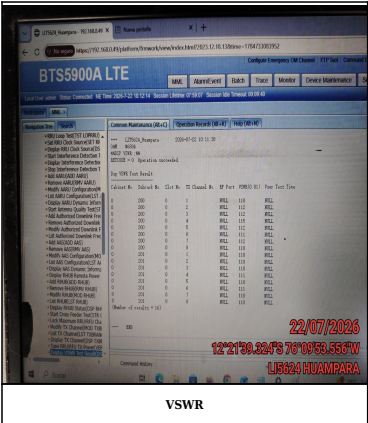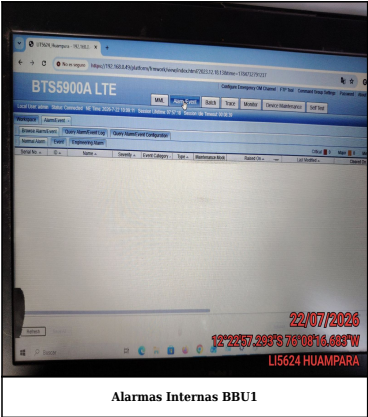

VI.- SISTEMA RADIANTE:

Antenas:

Sectoriales TDD: Estado: OK
Cantidad: 1
Modelo: ATD4516R8
Tilt m.1(°): OK

Microondas: Estado: N/A
Cantidad: 0

RRU Cantidad: 1
Conectores: OK
Cables RF/IF: OK

Luz de Balizaje: Estado: N/A
Cantidad: 0

Pararrayos: Estado: OK



Torre



Vulcanizado Conectores S1



Vulcanizado Conectores S2



Vulcanizado Conectores S3

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado: OK
Tipo: parres
Cantidad: 3
Resistencia (Ω): 1.4
Topología : único



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

NA

N/A

Observacion 1
