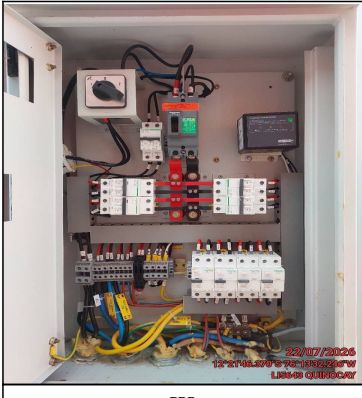


ZONA	QUINOCAY	NOMBRE SITE:	QUINOCAY	CODIGO SITE:	LI5643	FECHA :	2026-07-22 21:29:50
CRQ	CRQ000000103024	COORDENADAS	12°21'46.392"S 76°13'32. 024"W	TÉCNICO RESPONSABLE	Alexis Ceraso		

I .- INFRAESTRUCTURA

Site:	Modelo:	Greenfield		
	Tipo:	Indorr		
Torre:	Tipo:	Autosoportada triangular		
	Estado:	OK		
	Altura (m):	20		
	Verticalidad:	OK		
	Pintura:	OK		
	Escalera:	OK		
	Línea de vida:	OK		
	Cable Vientos:	OK		
	Grapas:	OK		
	Templadores:	OK		
	Base Templadores:	OK		
	Base de Torre:	OK		
Paredes:	OK			
Concertina:	OK			
Puerta:	OK			
Chapa:	OK			

II .- SUMINISTRO DE ENERGIA AC:

Tipo de Instalacion:	Súbterranea	
Nivel de Tensión:	LBT	
Sistema de Conexión:	Monofásica	
N° Suministro:	10019905634	
PDP:	Estado:	OK
	Voltaje 1(VAC):	220
	ITM(A):	50
	TVSS	OK
	Corriente 1(AAC):	10.4

III .- SUMINISTRO DE ENERGIA DC:

Gabinete Rectificador:	Estado:	OK		
	Marca:	Huawei		
	Ventiladores:	OK		
	A/A:	OK		
	Filtros:	OK		
Power Core:	Marca:	Huawei		
	Modelo:	MTS9000A		
	Controlador:			
	Modelo:	SMU02B		
	Voltaje (VDC):	51		
	Carga (ADC):	17		
	LVBD/BLVD(VDC):	43		
	LVLDD/LLVD(VDC):	47		
	Módulos:	Estado:	OK	
		Modelo1:	R4850G	
		Cantidad1:	2	
Bancada Total 1:	Estado:	OK		
	Cantidad:	3		
	Voltaje (V):	51		
	Marca1:	Huawei		
	Modelo1:	ESM-48150A1		
	Capacidad1(Ah):	150		
	Autonomia (Hr):	26		

IV .- GABINETE DE TRANSMISION:

Gabinete Tx1:

Estado:

Ventiladores:

A/A:

Filtros:

Radios (#):

Routers (#):

Modem (#):

BBU (#):

Switch (#):

Media Converter (#):

OK

OK

OK

OK

1

1

0

1

0

0



Gabinete Tx 1 Abierto



Pasamuro Gabinete Tx 1

V .- BTS:

BBU:

Tipo:

Estado:

FAN:

Cable FO:

TDD

OK

OK

Estado:

Banda 1 (MHz):

Cantidad:

OK

3500

1

VSWR:

Alarmas Externas:

Alarmas Internas:


OK

OK


OK




Panoramica de BBU1

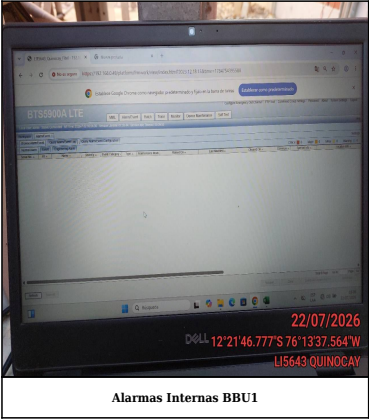


Alarmas Internas BBU1

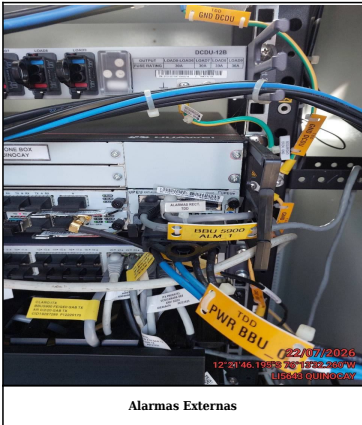

Alarmas Externas

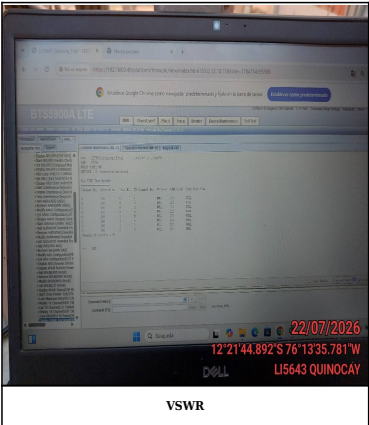

VSWR

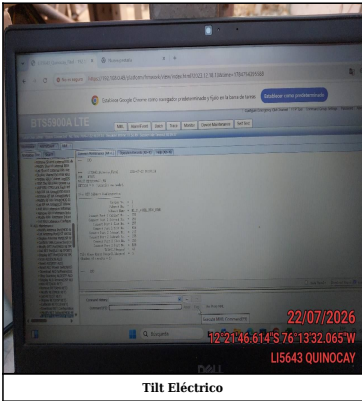

Tilt Eléctrico

VI .- SISTEMA RADIANTE:

Antenas:

Sectoriales TDD: Estado: OK
Cantidad: 1
Modelo: Nv
Tilt m.1(*): OK

Microondas: Estado: OK
Cantidad: 1



Torre



Vulcanizado Conectores S1



Vulcanizado Conectores S2



Vulcanizado Conectores S3

RRU Cantidad: 1
Conectores: OK
Cables RF/IF: OK

Luz de Balizaje: Estado: N/A
Cantidad: 0

Pararrayos: Estado: OK

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado: OK
Tipo: Parres
Cantidad: 3
Resistencia (Ω) 1.94
Topologia : Malla



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra


VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT

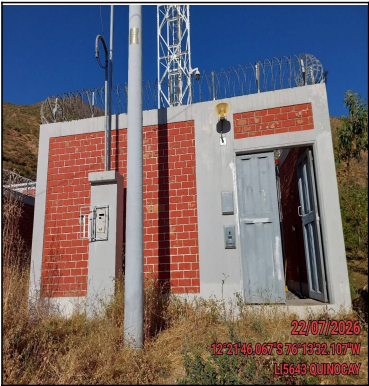

Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

NA

N/A

Observacion 1
