

ZONA	LAMPIAN	NOMBRE SITE:	LAMPIAN	CODIGO SITE:	LI1186	FECHA :	2026-07-23 14:57:49
CRQ	CRQ000000102970	COORDENADAS	-11.24027,-76,834615	TÉCNICO RESPONSABLE	Paolo Arias		

I.- INFRAESTRUCTURA

Site:	Modelo:	GREENFIELD
	Tipo:	GABINETE OUTDOOR
Torre:	Tipo:	VENTADA
	Estado:	OK
	Altura (m):	25
	Verticalidad:	OK
	Pintura:	OK
	Escalera:	OK
	Línea de vida:	OK
	Cable Vientos:	OK
	Grapas:	OK
	Templadores:	OK
	Base Templadores:	OK
	Base de Torre:	OK
Paredes:	OK	
Concertina:	OK	
Puerta:	OK	
Chapa:	OK	



VISTA PANORAMICA DEL SITE




VISTA PARED PARIMETRICA

II.- SUMINISTRO DE ENERGIA AC:

Tipo de Instalacion:	Aérea
Nivel de Tensión:	LMT
Sistema de Conexión:	Trifásica
N° Suministro:	NV

PDP:	Estado:	OK
	Voltaje 1(VAC):	0
	ITM(A):	60
	TVSS	OK
	Corriente 1(AAC):	0

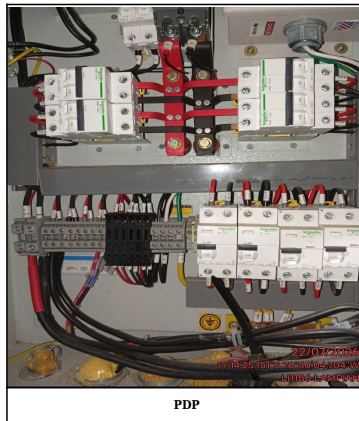

PDP

III.- SUMINISTRO DE ENERGIA DC:

Gabinete Rectificador:	Estado:	OK
	Marca:	HUAWEI
	Ventiladores:	OK
	A/A:	OK
	Filtros:	OK
Power Core:	Marca:	HUAWEI
	Modelo:	HUAWEI
	Controlador:	
	Modelo:	SMU02B
	Voltaje (VDC):	51
	Carga (ADC):	20
	LVBD/BLVD(VDC):	43
	LVLVD/LLVD(VDC):	46
	Módulos:	Estado: OK
	Modelo1:	R4850G
	Cantidad1:	2

Bancada Total 1:	Estado:	OK
	Cantidad:	3
	Voltaje (V):	51
	Marca1:	HUAWEI
	Modelo1:	ESM-48150A1
	Capacidad1(Ah):	150
	Autonomía (Hr):	18



Rectificador 1



Power Core 1

IV.- GABINETE DE TRANSMISION:

Gabinete Tx1:

Estado:

Ventiladores:

A/A:

Filtros:

Radios (#):

Routers (#):

Modem (#):

BBU (#):

Switch (#):

Media Converter (#):

OK

OK

OK

OK

1


0

0

1

1

1

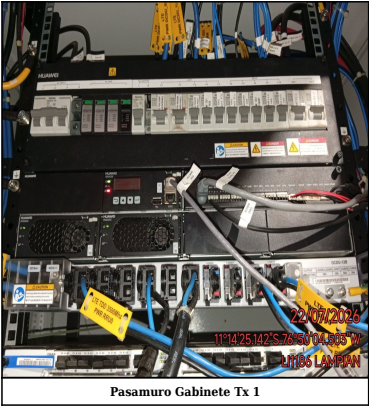

V .- BTS:

BBU:

Tipo:

Estado:

FAN:

Cable FO:

BBU5900

OK

OK

Estado:

Banda 1 (MHz):

Cantidad:

OK

0

0

VSWR:



Alarmas Externas:

Alarmas Internas:

OK

OK

OK

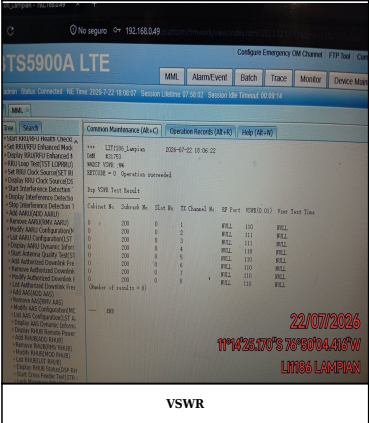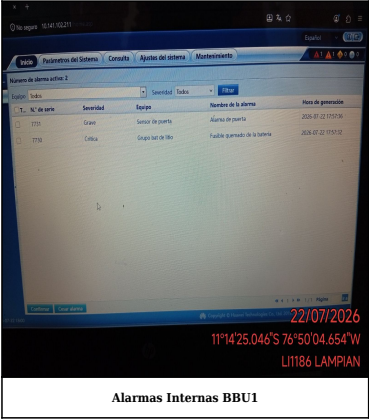

VI .- SISTEMA RADIANTE:

Antenas:

Sectoriales TDD:

Estado: OK
Cantidad: 5
Modelo: NV
Tilt m.1(°): OK

Microondas:

Estado: OK
Cantidad: 6

RRU

Cantidad: 10
Conectores: OK
Cables RF/IF: OK

Luz de Balizaje:


Estado: OK
Cantidad: 0

Pararrayos:

Estado: OK




Torre



Vulcanizado Conectores S1



Vulcanizado Conectores S2



Vulcanizado Conectores S3

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado: OK
Tipo: PARRES
Cantidad: 3
Resistencia (Ω): 3
Topologia : MALLA



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

NA

N/A

Observacion 1
