

ZONA	VEGUETA	NOMBRE SITE:	MEDIO_MUNDO_FITEL	CODIGO SITE:	LI5414	FECHA :	2026-07-23 20:28:44
CRQ	CRQ000000301009	COORDENADAS	medio mundo	TÉCNICO RESPONSABLE	Jhamel Sotelo		

I .- INFRAESTRUCTURA

Site:	Modelo:	greenfield		
	Tipo:	indoor		
Torre:	Tipo:	autosoportada triangular		
	Estado:	OK		
	Altura (m):	25		
	Verticalidad:	OK		
	Pintura:	OK		
	Escalera:	OK		
	Línea de vida:	OK		
	Cable Vientos:	N/A		
	Grapas:	N/A		
	Templadores:	N/A		
	Base Templadores:	N/A		
	Base de Torre:	OK		
Paredes:	OK			
Concertina:	OK			
Puerta:	OK			
Chapa:	OK			


VISTA PANORAMICA DEL SITE




VISTA PARED PARIMETRICA



II .- SUMINISTRO DE ENERGIA AC:

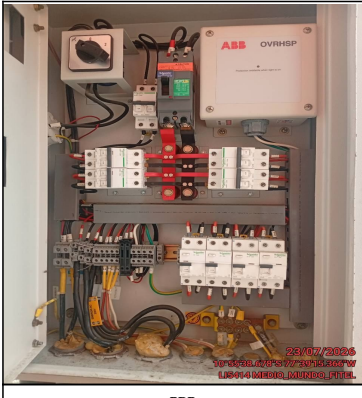Tipo de Instalacion:	Súbterranea		
Nivel de Tensión:	LBT		
Sistema de Conexión:	Monofásica		
N° Suministro:	0		
PDP:	Estado:		OK
	Voltaje 1(VAC):		222.8
	ITM(A):		50
	TVSS		OK
	Corriente 1(AAC):		14.8

PDP

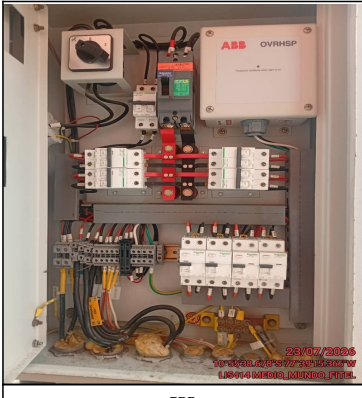

III .- SUMINISTRO DE ENERGIA DC:

Gabinete Rectificador:	Estado:	OK		
	Marca:	huawei		
	Ventiladores:	OK		
	A/A:	OK		
	Filtros:	OK		
Power Core:	Marca:	huawei		
	Modelo:	mts9000a		
	Controlador:			
	Modelo:	smu02b		
	Voltaje (VDC):	51		
	Carga (ADC):	17.1		
	LVBD/BLVD(VDC):	43.5		
	LVLD/LLVD(VDC):	47		
	Módulos:	Estado:	OK	
		Modelo1:	r4850g	
		Cantidad1:	1	
Bancada Total 1:	Estado:	OK		
	Cantidad:	1		
	Voltaje (V):	51		
	Marca1:	otros		
	Modelo1:	esm4850a		
	Capacidad1(Ah):	150		
	Autonomia (Hr):	17		

Rectificador 1



Power Core 1



IV .- GABINETE DE TRANSMISION:

Gabinete Tx1:	Estado:	OK
	Ventiladores:	OK
	A/A:	OK
	Filtros:	OK
	Radios (#):	1
	Routers (#):	0
	Modem (#):	0
	BBU (#):	1
	Switch (#):	0
	Media Converter (#):	0



Gabinete Tx 1 Abierto




Pasamuro Gabinete Tx 1

V.- BTS:

BBU:	Tipo:	tdd35099
	Estado:	OK
	FAN:	OK
	Cable FO:	Estado: OK
		Banda 1 (MHz): 3500
		Cantidad: 1
	VSWR:	OK
	Alarmas Externas:	OK
	Alarmas Internas:	OK




Panoramica de BBU1

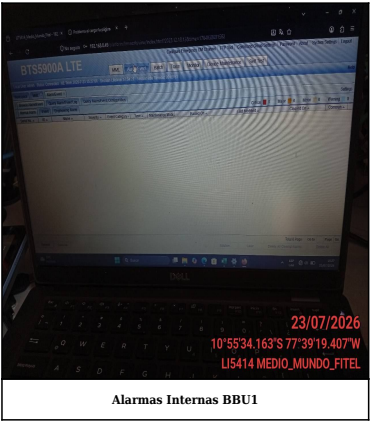


Alarmas Internas BBU1



Alarmas Externas

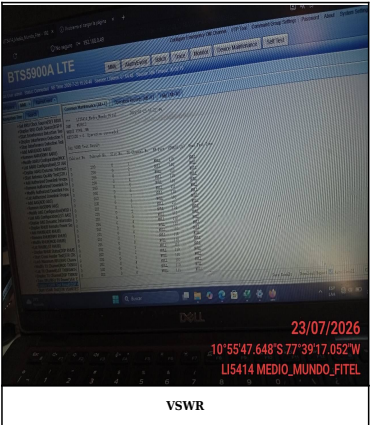

VSWR

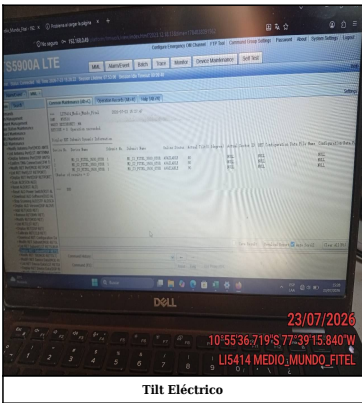

Tilt Eléctrico

VI.- SISTEMA RADIANTE:

Antenas:

Sectoriales TDD: Estado: OK
Cantidad: 2
Modelo: nv
Tilt m.1(°): N/A

Microondas: Estado: OK
Cantidad: 1



Torre



Vulcanizado Conectores S1

RRU Cantidad: 1
Conectores: OK
Cables RF/IF: OK

Luz de Balizaje: Estado: OK
Cantidad: 1

Pararrayos: Estado: OK



Vulcanizado Conectores S2



Vulcanizado Conectores S3

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado: OK
Tipo: parres
Cantidad: 4
Resistencia (Ω) 1.52
Topologia : malla



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

na

N/A

Observacion 1
