


ZONA	HUARAL	NOMBRE SITE:	EL TREBOL	CODIGO SITE:	LI5819	FECHA :	2026-09-15 12:39:52
CRQ	CRQ000000128932	COORDENADAS	11°30'04.10"S 77°14'09.86"W	TÉCNICO RESPONSABLE	Paolo Arias		

I.- INFRAESTRUCTURA

Site:	Modelo:	GREENFIELD
	Tipo:	GABINETE OUTDOOR
Torre:	Tipo:	AUTOSOPORTADA
	Estado:	OK
	Altura (m):	25
	Verticalidad:	OK
	Pintura:	OK
	Escalera:	OK
	Línea de vida:	OK
	Cable Vientos:	OK
	Grapas:	OK
	Templadores:	OK
	Base Templadores:	OK
	Base de Torre:	OK
Paredes:	OK	
Concertina:	OK	
Puerta:	OK	
Chapa:	OK	



VISTA PANORAMICA DEL SITE

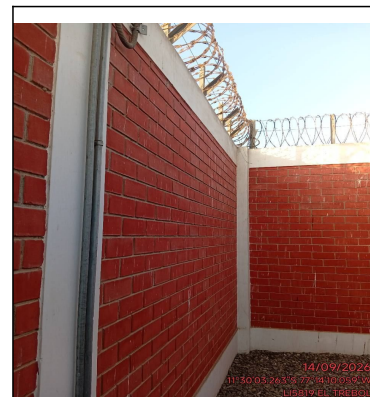


VISTA PARED PARIMETRICA

II .- SUMINISTRO DE ENERGIA AC:

Tipo de Instalacion:	Súbteranea
Nivel de Tensión:	LMT
Sistema de Conexión:	Trifásica
Nº Suministro:	NA

PDP:	Estado:	OK
	Voltaje 1(VAC):	212
	ITM(A):	50
	TVSS	OK
	Corriente 1(AAC):	7.44

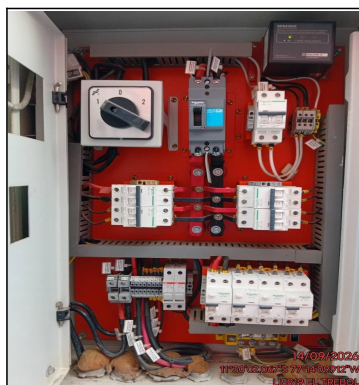


PDP

III .- SUMINISTRO DE ENERGIA DC:

Gabinete Rectificador:	Estado:	OK	
	Marca:	HUAWEI	
	Ventiladores:	OK	
	A/A:	OK	
	Filtros:	OK	
Power Core:	Marca:	HUAWEI	
	Modelo:	SMU02B	
	Controlador:		
		Modelo:	SMU02B
		Voltaje (VDC):	51
		Carga (ADC):	25
		LVBD/BLVD(VDC):0	
		LVLD/LLVD(VDC): 0	
	Módulos:	Estado:	OK
		Modelo1:	R4850G
		Cantidad1:	3
Bancada Total 1:	Estado:	OK	
	Cantidad:	4	
	Voltaje (V):	51	
	Marca1:	HUAWEI	
	Modelo1:	ESM48150A1	
	Capacidad1(Ah):	150	
	Autonomía (Hr):	24	



Rectificador 1

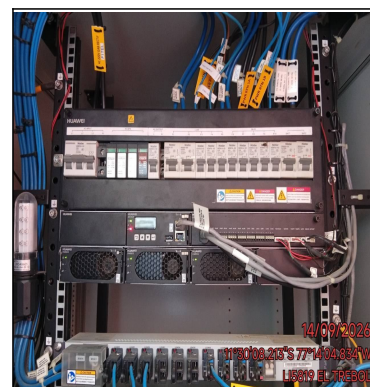


Power Core 1

IV .- GABINETE DE TRANSMISION:

Gabinete Tx1:

Estado:	OK
Ventiladores:	OK
A/A:	OK
Filtros:	OK
Radios (#):	1
Routers (#):	1
Modem (#):	0
BBU (#):	1
Switch (#):	0
Media Converter (#):	0

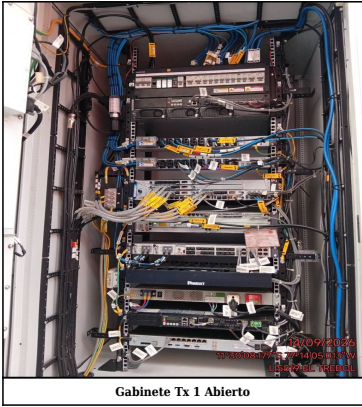

Gabinete Tx 1 Abierto



Pasamuro Gabinete Tx 1


V .- BTS:

BBU:

Tipo:	5900
Estado:	OK
FAN:	OK
Cable FO:	Estado: OK
	Banda 1 (MHz): 3500
	Cantidad: 3
	VSWR: OK
	Alarmas Externas: OK
	Alarmas Internas: OK




Panoramica de BBU1

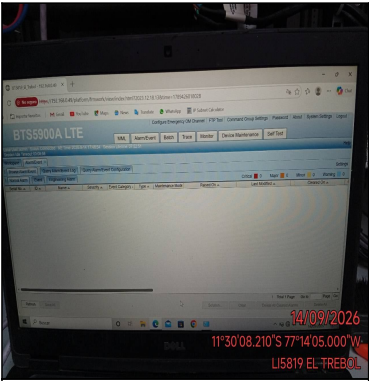

Alarmas Internas BBU1



Alarmas Externas

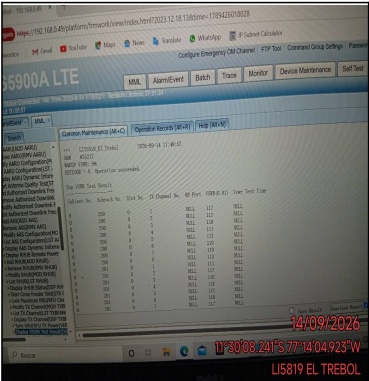

VSWR



Tilt Eléctrico

VI .- SISTEMA RADIANTE:

Antenas:

Sectoriales TDD:	Estado:	OK
	Cantidad:	3
	Modelo:	NV
	Tilt m.1(°):	OK

Microondas:	Estado:	OK
	Cantidad:	1



Torre



Vulcanizado Conectores S1

RRU	Cantidad:	3
	Conectores:	OK
	Cables RF/IF:	OK

Luz de Balizaje:	Estado:	N/A
	Cantidad:	0

Pararrayos:	Estado:	N/A
-------------	---------	-----



Vulcanizado Conectores S2



Vulcanizado Conectores S3

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado:	OK
Tipo:	PARRES
Cantidad:	2
Resistencia (Ω)	3.7
Topología :	MALLA



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

NA

N/A

Observacion 1
