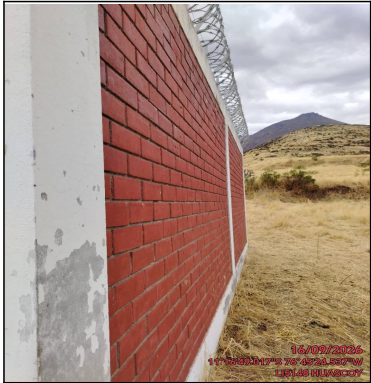


ZONA	ATAVILLOS ALTO	NOMBRE SITE:	HUASCOY	CODIGO SITE:	LI5148	FECHA :	2026-09-16 19:26:47
CRQ	CRQ120000008859	COORDENADAS	- 11.280347,- 76.756736	TÉCNICO RESPONSABLE	Paolo Arias		

I .- INFRAESTRUCTURA

Site:	Modelo:	GREENFIELD		
	Tipo:	GABINETE OUDOR		
Torre:	Tipo:	AUTOSOPORTADA		
	Estado:	OK		
	Altura (m):	25		
	Verticalidad:	OK		
	Pintura:	OK		
	Escalera:	OK		
	Línea de vida:	OK		
	Cable Vientos:	N/A		
	Grapas:	N/A	VISTA PANORAMICA DEL SITE	VISTA PARED PARIMETRICA
	Templadores:	N/A		
	Base Templadores:	N/A		
	Base de Torre:	OK		
Paredes:	OK			
Concertina:	OK			
Puerta:	OK			
Chapa:	N/A			

II .- SUMINISTRO DE ENERGIA AC:

Tipo de Instalacion:	Aérea	
Nivel de Tensión:	LBT	
Sistema de Conexión:	Monofásica	
N° Suministro:	NA	
PDP:	Estado:	OK
	Voltaje 1(VAC):	212
	ITM(A):	50
	TVSS	OK
	Corriente 1(AAC):	2.3



16/09/2024
11°14'49.523"S 76°47'52.019"W
L8148 HUA8007

PDP

III .- SUMINISTRO DE ENERGIA DC:

Gabinete Rectificador:	Estado:	OK		
	Marca:	HUAWEI		
	Ventiladores:	OK		
	A/A:	OK		
	Filtros:	OK		
Power Core:	Marca:	HUAWEI		
	Modelo:	HUAWEI		
	Controlador:	Modelo: SMU2D		
		Voltaje (VDC): 53		
		Carga (ADC): 15		
		LVBD/BLVD(VDC):43		
		LVLVD/LLVD(VDC): 46		
	Módulos:	Estado: OK	Rectificador 1	Power Core 1
		Modelo1: R4850G		
		Cantidad1: 2		
Bancada Total 1:	Estado:	OK		
	Cantidad:	2		
	Voltaje (V):	53		
	Marca1:	HUAWEI		
	Modelo1:	ESM48150A1		
	Capacidad1(Ah):	150		
	Autonomia (Hr):	20		

IV .- GABINETE DE TRANSMISION:

Gabinete Tx1:

Estado:	OK
Ventiladores:	OK
A/A:	OK
Filtros:	OK
Radios (#):	1
Routers (#):	1
Modem (#):	0
BBU (#):	1
Switch (#):	0
Media Converter (#):	0



Gabinete Tx 1 Abierto



Pasamuro Gabinete Tx 1


V .- BTS:

BBU:

Tipo:	BBU5900
Estado:	OK
FAN:	OK
Cable FO:	Estado: OK
	Banda 1 (MHz): 3500
	Cantidad: 1
VSWR: OK	
Alarmas Externas: OK	
Alarmas Internas: OK	




Panoramica de BBU1

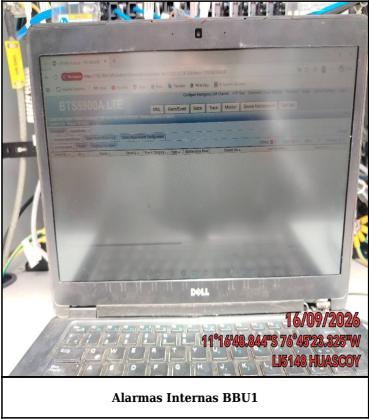

Alarmas Internas BBU1



Alarmas Externas

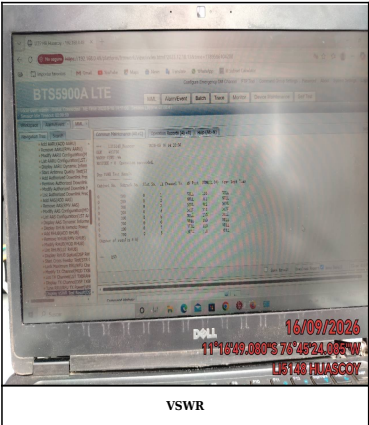

VSWR



Tilt Eléctrico

VI .- SISTEMA RADIANTE:

Antenas:


Sectoriales TDD:	Estado:	OK
	Cantidad:	1
	Modelo:	NV
	Tilt m.1(°):	OK

Microondas:	Estado:	OK
	Cantidad:	1

RRU	Cantidad:	1
	Conectores:	OK
	Cables RF/IF:	OK

Luz de Balizaje:	Estado:	OK
	Cantidad:	1

Pararrayos:	Estado:	OK
-------------	---------	----

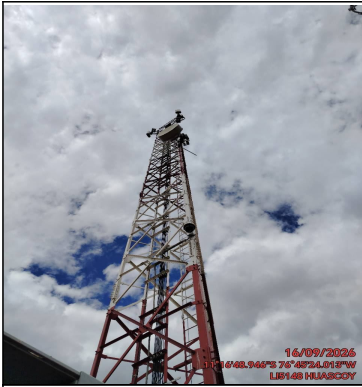

Torre



Vulcanizado Conectores S1



Vulcanizado Conectores S2



Vulcanizado Conectores S3

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado:	OK
Tipo:	PARRES
Cantidad:	3
Resistencia (Ω)	3
Topologia :	MALLA



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

VIII.- IMAGENES FINALES:

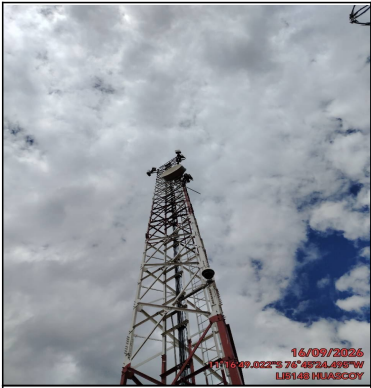


Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

NA

N/A

Observacion 1
