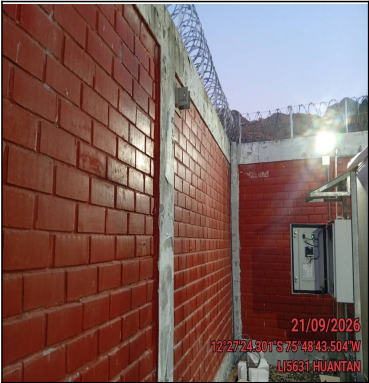


ZONA	HUANTAN	NOMBRE SITE:	HUANTAN	CODIGO SITE:	LI5631	FECHA :	2026-09-21 23:49:02
CRQ	CRQ000000132776	COORDENADAS	12°	TÉCNICO RESPONSABLE	Alcides Guevara		

I .- INFRAESTRUCTURA

Site:	Modelo:	GREENFIELD		
	Tipo:	INDOOR		
Torre:	Tipo:	ARRIOSTRADA		
	Estado:	OK		
	Altura (m):	15		
	Verticalidad:	OK		
	Pintura:	OK		
	Escalera:	OK		
	Línea de vida:	OK		
	Cable Vientos:	N/A		
	Grapas:	N/A		
	Templadores:	N/A	VISTA PANORAMICA DEL SITE	VISTA PARED PARIMETRICA
	Base Templadores:	N/A		
	Base de Torre:	OK		
Paredes:	OK			
Concertina:	OK			
Puerta:	OK			
Chapa:	OK			

II .- SUMINISTRO DE ENERGIA AC:

Tipo de Instalacion:	Aérea	
Nivel de Tensión:	LBT	
Sistema de Conexión:	Monofásica	
N° Suministro:	NA	
PDP:	Estado:	OK
	Voltaje 1(VAC):	213
	ITM(A):	50
	TVSS	OK
	Corriente 1(AAC):	4.76

III .- SUMINISTRO DE ENERGIA DC:

Gabinete Rectificador:	Estado:	OK		
	Marca:	HUAWEI		
	Ventiladores:	OK		
	A/A:	OK		
	Filtros:	OK		
Power Core:	Marca:	HUAWEI		
	Modelo:	ETP-48200		
	Controlador:	Modelo: SMU02B		
		Voltaje (VDC): 51		
		Carga (ADC): 14.1		
		LVBD/BLVD(VDC):41		
		LVLDD/LLVD(VDC): 46		
	Módulos:	Estado: OK	Rectificador 1	Power Core 1
		Modelo1: R4850G		
		Cantidad1: 2		
Bancada Total 1:	Estado:	OK		
	Cantidad:	30		
	Voltaje (V):	51		
	Marca1:	HUAWEI		
	Modelo1:	ESM-48150A1		
	Capacidad1(Ah):	150		
	Autonomia (Hr):	28		

IV .- GABINETE DE TRANSMISION:

Gabinete Tx1: Estado: OK
Ventiladores: OK
A/A: OK
Filtros: OK
Radios (#): 0
Routers (#): 1
Modem (#): 0
BBU (#): 1
Switch (#): 0
Media Converter (#): 0



Gabinete Tx 1 Abierto



Pasamuro Gabinete Tx 1


V .- BTS:

BBU: Tipo: BBU5900
Estado: OK
FAN: OK
Cable FO: Estado: OK
Banda 1 (MHz): 3500
Cantidad: 1

VSWR: OK
Alarmas Externas: OK
Alarmas Internas: OK




Panoramica de BBU1

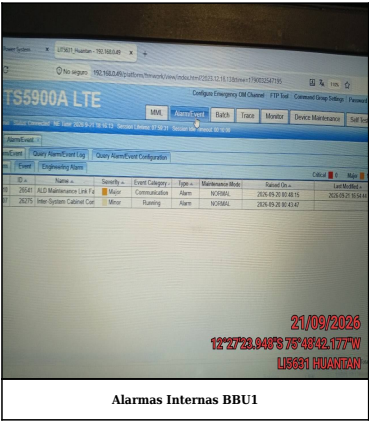


Alarmas Internas BBU1



Alarmas Externas

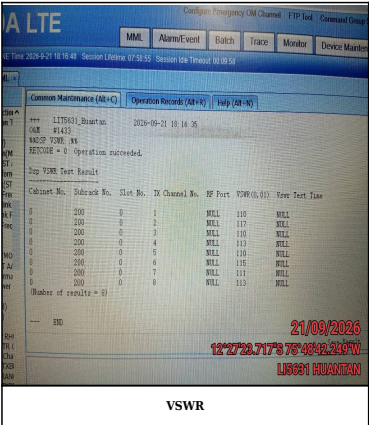

VSWR

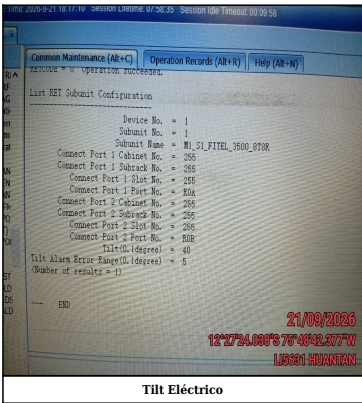

Tilt Eléctrico

VI .- SISTEMA RADIANTE:

Antenas:

Sectoriales TDD:	Estado:	OK
	Cantidad:	1
	Modelo:	ATD
	Tilt m.1(°):	OK

Microondas:	Estado:	N/A
	Cantidad:	0

RRU	Cantidad:	0
	Conectores:	OK
	Cables RF/IF:	OK

Luz de Balizaje:	Estado:	OK
	Cantidad:	1

Pararrayos:	Estado:	OK
-------------	---------	----




Torre



Vulcanizado Conectores S1



Vulcanizado Conectores S2



Vulcanizado Conectores S3

VII.- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

Estado:	OK
Tipo:	mallas
Cantidad:	2
Resistencia (Ω)	7.24
Topología :	HORIZONTAL



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

VIII.- IMAGENES FINALES:



Foto Panorámica del Interior del Site



Resistencia de SPAT



Pozo a tierra

IX.- OBSERVACIONES FINALES:

NA

N/A

Observacion 1
